

รายงานการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์

ผู้มาประชุม

๑. นายปฐม	เฉลยวาเรศ	อทช.	ประธาน
๒. นายประศักดิ์	บัณฑิต	รทช.	
๓. นายไกรวัลย์	โรจนานุกูล	รทช.	
๔. นายโกสินท์	พิทยะเวสต์สุนทร	วศญ.	
๕. นายวิศว์	รัตนโชติ	วศญ.	
๖. นายผดุงศักดิ์	สรุจิกำจรวัฒนะ	ผอ.กผง.	
๗. นายพีรพัฒน์	ภูตันติกุล	ผส.คก.	
๘. นายวาทัญญ	ฐิตานวงศ์	ผส.กท.	
๙. นายอภิชัย	วชิระปรากการพงษ์	ผส.กส.	
๑๐. นายจีระพงษ์	ปิณฑะบุตร	ผส.สอ.	
๑๑. นายศาศวัต	ภูริภัตสรกุล	ผส.อป.	
๑๒. นายชูชัย	พนัสอัมพร	ผส.บร.	
๑๓. นายทวี	แสงสุวรรณโณ	ผส.วว.	
๑๔. นายณรงค์	คู่บารมี	ผส.อร.	
๑๕. นางสาวฉัตรนภา	รักษาติเจริญ	ผส.กม.	
๑๖. นายสมโภชน์	เรืองพระยา	ผส.บก.	
๑๗. นายชาครีย์	บำรุงวงศ์	ผอ.ศทส.	
๑๘. นายพฤษภ	ศรีบุรี	ผอ.สพร.	
๑๙. นายทักษิณ	บุญต่อ	ผส.ทช.ที่ ๘	
๒๐. นางวัชรีย์	คุณากรสิริรักษ์	แทน ผส.อร.	
๒๑. นายชยทัต	วัฒนกุล	ผอ.กสป.	
๒๒. นางสาวโมรี	วุ่นซิว	รท.ผอ.สตน.	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอาคม	ตันติพงศ์อำภา	ผชช.สสท.
๒. นายธนะชัย	หล่ออภิบาลกุล	ผชช.กผง.
๓. นางสาวณัฐมนิษฐ์	ศิริเขต	ผอ.กชป.สบก.
๔. นางดารณี	แจ่มพุดทรา	ผอ.สอก.สบก.
๕. นางสาววิมล	ตั้งธนศฤงคาร	ผอ.กงบ.สบก.
๖. นายสมเกียรติ	ชัยประเสริฐ	ผอ.กทร.สภท.
๗. นายบุญจอม	พรหมทอง	ผอ.กตป.กผง
๘. นายธงชัย	วรวิทย์ธาดา	ผอ.กวผ.สปร.
๙. นายภูมิรัฐ	ทองอุดม	ผอ.กวพ.สอร.
๑๐. นายสันติภาพ	ศิริยงค์	ผอ.กพว.สอป.
๑๑. นายกชกร	ไฉ่วศิริ	ผอ.ขทช.เชียงใหม่

๑๒. นายนพปฎล	เสียงบุญ	สปร.
๑๓. นางสาวกนกพร	มีชัยตระกูล	สบก.
๑๔. นางสาวรัชนี	ไร่ดี	สบก.
๑๕. นายฐานันดร	สวัสดี	กผง.
๑๖. นายนิธิ	หาญรักษ์	ศทส.
๑๗. นางสาวมณฑนา	บรรลือศักดิ์	กสป.

เริ่มประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ ๑

อทช.

เวลา ๑๓.๓๐น.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๔ เรื่อง

การดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

จากที่ได้หารือกันเรื่องเงินกันหล่อมปีในส่วนแรก รายการปีเดียวเบิกจ่ายได้ ๗๓ % ก็เบิกจ่ายได้ดี มีค่าจ้างที่ปรึกษาที่เบิกจ่ายเป็นรายเดือนเราไม่สามารถไปเร่งรัดได้ ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในส่วนที่ไม่ใช่ค่าก่อสร้าง เรื่องค่าก่อสร้างขอฝากทาง สกส.และ สกท.เร่งรัดให้แล้วเสร็จด้วย เพราะว่าก็จะเกี่ยวเนื่องกับเงินกันหล่อมปี ก็ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ในส่วนงบผูกพันเดิมขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อย ฝากหน่วยทุกหน่วยที่วางแผนขอให้พยายามดำเนินการให้ได้ตามแผนที่ได้เสนอแผนนั้นด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบทุกหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

เรื่องที่ ๒

อทช.

การลงนามในสัญญา

ขอซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการลงนามในสัญญาที่ทาง คค.เห็นชอบผลการประกวดราคาแล้ว ทาง สบร. และ สอป. ได้ออกงวดเงินไปแล้ว ในการลงนามในสัญญามีข้อแนบท้ายอยู่ในสัญญา คือ การค้ำประกันสัญญาต้องเป็นวันเดียวกับที่ลงนามในสัญญา ในช่วงเทศกาลผมลองสอบถาม สทช.ที่ ๒ และ สทช.ที่ ๕ ไม่มีใครทราบการดำเนินงานดังกล่าวเลย จึงขอให้ สบก.ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยได้รับทราบโดยทั่วกัน ขอให้ทำหนังสือซักซ้อมเพราะเป็นข้อกำหนดใหม่ที่ต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติจะไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบ สบก.ทำหนังสือซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการลงนามในสัญญา

เรื่องที่ ๓

อทช.

เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับมูลค่าของงวดงานที่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าได้รับงวดเงินแล้วก็สามารถลงนามในสัญญาได้เลย ฝากท่านรองอธิบดี และท่านวิศวกรใหญ่ช่วยสอบถามและติดตามเรื่องนี้ด้วย เรื่องที่เป็นห่วงคือ เกรงหน่วยงานในส่วนภูมิภาคจะดำเนินการไม่สอดคล้องกับระเบียบ ทั้งเรื่องการลงนามในสัญญา และเรื่องการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง ขอฝาก กผง.ช่วยดำเนินการเร่งรัดให้ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๔

อทช.

ยางพารา

ฝาก ผส.พิรพัฒน์ ภูตันทิกุล ช่วยดูเรื่องยางพารา วันพรุ่งนี้น่าจะจบเรื่องราคา ขอให้นำมาหารือเรื่องกำหนด TOR ทั้งนี้ขอให้ ผส.พิรพัฒน์ ภูตันทิกุล จัดทีมยางพารานัดประชุมอีกครั้ง ประชุมผ่านระบบ ZOOM ที่ห้องประชุมชั้น ๑๑ หลังจากที่ผมประชุมกับกรมทางหลวงในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบ ผส.พิรพัฒน์ฯ นำเรื่องยางพาราประชุมกับท่านอธิบดี

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

ผส.บก.

กรมทางหลวงชนบท ได้ประชุมผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ และจัดส่งให้ผู้บริหารทุกท่านทราบ และพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าว

ในการนี้ ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

ผอ.กผง.

เรื่องติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบท จำนวน ๒ เรื่อง
 ๓.๑ ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมทางหลวงชนบท
 กผง. ขอรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบทดังนี้

★ ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔

งบประมาณทั้งสิ้น	๔๘,๗๘๙.๘๔๒๑ ล้านบาท
เบิกจ่าย	๑,๙๓๓.๖๓๑๒ ล้านบาท (๓.๙๖ %)
๑. งบประจำ	๑,๕๘๗.๗๑๗๘ ล้านบาท (๓.๒๕%)
เบิกจ่าย	๔๔๘.๔๑๓๔ ล้านบาท (๒๘.๒๔%)
๒. งบลงทุน	๔๗,๒๐๒.๑๒๔๓ ล้านบาท (๙๖.๗๕%)
เบิกจ่าย	๑,๔๘๕.๒๑๗๘ ล้านบาท (๓.๑๕ %)
• ผู้กู้เพิ่มเติม	๖,๐๑๑.๑๙๙๙ ล้านบาท (๑๒.๗๔%)
เบิกจ่าย	๙๒๔.๖๕๕๖ ล้านบาท (๑๕.๓๘%)
• รายการใหม่	๔๑,๑๙๐.๙๒๔๔ ล้านบาท (๘๗.๒๖ %)
เบิกจ่าย	๕๖๐.๕๖๒๒ ล้านบาท (๑.๓๖%)
- ค่าที่ดิน + ค่าอุปกรณ์	๑,๓๘๖.๐๐๐๐ ล้านบาท(๓.๓๖%)
เบิกจ่าย	๑๒๙.๗๕๗๕ ล้านบาท (๙.๓๖%)
- งานดำเนินการเอง	๔,๓๐๓.๙๒๒๑ ล้านบาท(๑๐.๔๕ %)
เบิกจ่าย	๔๒๓.๗๕๑๕ ล้านบาท (๙.๘๕%)
- งานจ้างเหมา	๓๕,๕๐๑.๐๐๒๓ ล้านบาท (๐.๐๒%)
เบิกจ่าย	๗.๐๕๓๐ ล้านบาท (๐.๐๒%)

★ แผนเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ ข้อมูลวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เดือน		ค.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
เป้าหมายรัฐบาล (งบปี ๖๓)	%			๓๒			๕๕			๗๗			๑๐๐
แผนเบิกจ่าย ๖๔ (ส่ง สป.)	ส.บ.	๔๔๕.๐๑๔๕	๑,๑๓๘.๑๐๑๙	๓,๕๕๗.๘๑๗๗	๗,๑๓๗.๔๗๘๗	๑๒,๓๗๐.๑๖๐๕	๒๑,๐๖๖.๘๒๕๓	๒๗,๘๐๒.๙๑๐๘	๓๓,๐๑๗.๒๗๑๒	๓๗,๓๙๗.๘๐๐๔	๔๒,๒๙๖.๓๗๕๑	๔๕,๒๘๘.๓๗๑๑	๔๘,๗๘๙.๘๔๒๑
	%	๐.๘๕	๒.๔๖	๗.๓๕	๑๔.๖๓	๒๕.๓๕	๔๓.๑๘	๕๖.๙๙	๖๗.๖๗	๗๖.๖๕	๘๖.๖๙	๙๒.๘๒	๑๐๐
แผนเบิกจ่าย ๖๔ (ส่ง คค.)	ส.บ.	๒๖๗.๘๒๙๑	๑,๐๕๐.๙๑๖๕	๓,๕๕๗.๘๑๗๗	๗,๑๓๗.๔๗๘๗	๑๒,๓๗๐.๑๖๐๕	๒๑,๐๖๖.๘๒๕๓	๒๗,๘๐๒.๙๑๐๘	๓๓,๐๑๗.๒๗๑๒	๓๗,๓๙๗.๘๐๐๔	๔๒,๒๙๖.๓๗๕๑	๔๕,๒๘๘.๓๗๑๑	๔๘,๗๘๙.๘๔๒๑
	%	๐.๕๕	๒.๑๕	๗.๓๕	๑๔.๖๓	๒๕.๓๕	๔๓.๑๘	๕๖.๙๙	๖๗.๖๗	๗๖.๖๕	๘๖.๖๙	๙๒.๗๕	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย ๖๔	ส.บ.	๑๑๕.๑๔๐๐	๗๘๙.๙๐๗๖	๑,๕๗๒.๘๐๑๗	๑,๙๓๓.๖๓๑๒								
	%	๐.๒๔	๑.๖๒	๓.๒๒	๓.๙๖								

ผอ.กผง.

★ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

ส่วนภูมิภาค

หน่วย : ลบ.

หน่วยดำเนินการ	งปม.ทั้งสิ้น	PO	เบิกจ่าย ณ ๑๕ ม.ค.๖๔	ร้อยละ	คงเหลือ
สทช.ที่ ๑ และ ขทช.	๑๙๑.๐๙๕๒	๑๐.๑๘๘๘	๑๗.๔๑๒๗	๙.๑๑	๑๖๓.๔๙๓๗
สทช.ที่ ๒ และ ขทช.	๑๓๘.๒๔๘๓	๓๑.๓๔๒๗	๒๐.๗๓๒๘	๑๕.๐๐	๘๖.๕๑๕๕
สทช.ที่ ๓ และ ขทช.	๑๙๑.๐๕๓๖	๓๓.๓๒๐๔	๑๗.๕๖๔๒	๙.๑๙	๑๗๓.๔๘๙๔
สทช.ที่ ๔ และ ขทช.	๒๔๒.๐๑๒๑	๒๔.๗๑๙๔	๓๕.๖๓๑๑	๑๔.๗๒	๑๙๖.๖๖๑๐
สทช.ที่ ๕ และ ขทช.	๕๕๙.๕๙๐๐	๒๑๐.๗๔๓๘	๗๖.๙๕๙๒	๑๔.๐๐	๒๖๑.๘๓๐๘
สทช.ที่ ๖ และ ขทช.	๒๒๗.๔๙๕๐	๑๓.๙๘๕๔	๓๗.๓๗๓๘	๑๖.๔๓	๑๘๙.๕๑๑๒
สทช.ที่ ๗ และ ขทช.	๒๘๐.๘๕๘๕	๑๕.๓๘๒๓	๕๑.๗๖๑๓	๑๘.๔๓	๒๒๙.๐๙๖๒
สทช.ที่ ๘ และ ขทช.	๒๒๕.๖๕๙๑	๔๔.๓๗๑๕	๕๒.๑๑๘๓	๒๓.๑๐	๑๗๓.๕๔๐๘
สทช.ที่ ๙ และ ขทช.	๒๒๓.๓๓๕๑	๓๐.๗๕๕๓	๒๑.๙๙๐๙	๙.๘๕	๑๙๑.๓๔๔๑
สทช.ที่ ๑๐ และ ขทช.	๒๗๘.๑๔๐๔	๙๙.๗๗๐๔	๓๓.๙๗๒๙	๑๒.๒๑	๒๔๔.๑๖๗๕
สทช.ที่ ๑๑ และ ขทช.	๕๗๕.๗๔๗๕	๑๓๓.๗๔๖๖	๓๙.๐๘๒๐	๖.๗๙	๔๓๖.๖๖๕๕
สทช.ที่ ๑๒ และ ขทช.	๑,๗๔๕.๒๓๖๕	๔๒๖.๕๕๒๑	๔๕.๘๗๘๕	๒.๖๓	๑,๒๙๘.๖๕๘๔
สทช.ที่ ๑๓ และ ขทช.	๑๗๗.๒๘๗๐	๓๖.๐๕๗๒	๒๗.๔๖๕๘	๑๕.๔๙	๑๔๐.๘๒๑๒
สทช.ที่ ๑๔ และ ขทช.	๒๓๗.๖๔๒๓	๔๒.๖๘๙๗	๓๕.๖๒๓๐	๑๔.๙๙	๑๙๙.๐๑๙๖
สทช.ที่ ๑๕ และ ขทช.	๑๗๒.๖๗๕๘	๑๑.๗๒๗๗	๕๖.๘๘๗๑	๓๒.๙๐	๑๖๐.๘๘๘๑
สทช.ที่ ๑๖ และ ขทช.	๕๒๐.๐๑๑๘	๘๘.๑๑๐๑	๓๒.๓๘๙๑	๖.๒๓	๔๘๗.๖๒๒๗
สทช.ที่ ๑๗ และ ขทช.	๒๐๙.๘๓๖๑	๓๗.๘๕๕๒	๒๐.๓๒๐๗	๙.๖๘	๑๘๙.๕๑๕๓
สทช.ที่ ๑๘ และ ขทช.	๒๓๖.๗๔๙๓	๘๗.๙๙๙๙	๒๔.๕๐๗๐	๑๐.๓๕	๑๙๒.๒๔๒๓
รวมส่วนภูมิภาค	๖,๔๒๒.๖๗๓๔	๑,๓๘๕.๒๙๑๗	๖๔๗.๖๐๐๕	๑๐.๐๘	๕,๗๗๕.๐๗๒๙

★ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

ส่วนกลาง

หน่วย : ลบ.

หน่วยดำเนินการ	งปม.ทั้งสิ้น	PO	เบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๔	ร้อยละ	คงเหลือ
สทท.	๔,๕๙๑.๑๐๓๙	๒,๖๐๔.๖๙๖๙	๖๒๔.๖๔๑๙	๑๓.๖๑	๑,๙๖๑.๔๖๕๐
สทส.	๑,๓๙๘.๖๒๓๙	๙๔๗.๐๑๔๓	๗๖.๒๔๑๐	๕.๔๕	๑,๓๒๒.๓๘๒๙
สทอ.และ สทช.	๑๑๑.๐๔๗๘	๘.๑๓๔๗	๑๔.๐๒๗๓	๑๒.๖๓	๙๙.๐๒๐๕
สทอ.	๕.๓๖๐๖	๐.๐๓๗๗	๑.๔๐๔๖	๒๖.๒๐	๔.๙๕๖๐
สทอ.	๑๗๘.๓๓๖๑	๐.๑๕๕๑	๐.๗๒๙๙	๐.๔๑	๑๗๗.๖๐๖๑
สทอ.	๘๗.๙๕๖๖	๐.๒๗๕๙	๑.๘๓๐๔	๒.๐๘	๘๖.๑๒๐๗
กผง.	๖.๖๑๙๔	๔.๓๕๗๐	๐.๕๕๘๘	๘.๒๙	๒.๐๖๐๖
สทอ.	๒๖๕.๓๓๕๐	๐.๒๓๗๕	๐.๙๒๙๔	๐.๓๕	๒๖๔.๔๐๕๖
สทอ.	๑.๕๒๗๔	-	๐.๕๒๘๘	๓๔.๖๒	๐.๙๙๘๖
สทอ.	๐.๑๐๐๐	-	๐.๐๒๙๐	๒๙.๐๔	๐.๐๗๑๐
สทอ.	๒.๗๑๓๔	-	๑.๑๔๔๗	๔๒.๑๘	๑.๕๖๘๗
สทอ.	๙๙.๔๐๐๐	๔.๕๐๘๕	๐.๓๔๘๓	๐.๓๕	๙๔.๘๙๑๗
สทอ.	๑๖.๐๖๙๕	๘.๔๗๓๙	๖.๒๑๗๗	๓๘.๖๙	๑๐.๘๕๑๘
สทอ.	๐.๒๘๙๐	๐.๐๓๒๑	๐.๐๘๘๗	๓๑.๐๕	๐.๒๐๐๓
สทอ.	๑๐.๘๘๗๖	๐.๘๓๓๑	๓.๑๒๐๔	๒๘.๗๗	๖.๗๖๗๒
สทอ.	๐.๐๒๘๒	๐.๐๒๔๐	๐.๐๐๔๒	๑๔.๙๗	-
กสท.	๐.๙๐๑๕	-	๐.๑๒๓๖	๑๓.๗๑	๐.๗๗๗๙
ค่าที่ดิน	๑,๓๘๖.๐๐๐๐	-	๑๒๙.๗๕๗๕	๙.๓๖	๑,๒๕๖.๒๔๒๕
เบิกจ่ายในนามกรมฯ	๓๔,๑๘๙.๑๔๕๒	๕.๓๗๗๑	๔๒๔.๓๑๓๔	๑.๒๔	๓๓,๗๖๔.๘๓๑๘
รวมส่วนกลาง	๔๒,๓๕๑.๔๐๕๑	๓,๕๘๔.๑๕๗๗	๑,๒๘๖.๐๓๐๘	๓.๐๔	๔๑,๐๖๕.๓๗๔๓
รวมทั้งสิ้น	๔๘,๗๗๔.๐๗๘๕	๔,๙๖๙.๔๔๙๔	๑,๙๓๓.๖๓๑๓	๓.๙๖	๔๖,๘๔๐.๔๔๗๒

ผอ.ภผง.

★ **ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๔ (ภาพรวม)**

จำนวน ๔,๕๘๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๙๗๖.๖๒๑๓ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	วงเงิน (ลบ.)	คิดเป็นร้อยละ
- ยังไม่รายงานสถานภาพ	๒๑	๐.๔๖	๑,๑๖๑.๙๒๔๓	๓.๓๒
- สำรองออกแบบ/ประมาณราคา	๑๖	๐.๓๕	๓๔๖.๗๔๕๔	๐.๙๙
- ราคาากลาง	๔๖	๑.๐๐	๔๗๔.๑๓๐๐	๑.๓๖
- ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๒๑	๐.๔๖	๒๑๔.๒๑๐๐	๐.๖๑
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๖๑๗	๑๓.๔๕	๘,๔๔๙.๔๖๗๐	๒๔.๑๖
- ทราบผลจัดซื้อจัดจ้าง	๑๒๒	๒.๖๖	๑,๕๒๑.๗๗๑๘	๔.๓๕
- การอนุมัติสิ่งซื้อจัดจ้าง	๓,๔๐๙	๗๔.๓๒	๒๒,๐๙๙.๖๑๗๘	๖๓.๑๘
- ลงนามในสัญญา	๓๓๕	๗.๓๐	๗๐๘.๗๕๕๐	๒.๐๓

★ **งบประมาณปี ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ ที่กันไว้เบิกเหลือปี**

ปีงบประมาณ	จำนวนที่ขอ		กรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	จำนวนรายการ ที่แล้วเสร็จ	จำนวน คงเหลือ
	จำนวน	งบม.	จำนวน	งบม.				
๒๕๖๓	๑,๑๘๖	๗,๖๖๒.๓๐๕๒	๑,๑๘๖	๗,๖๖๒.๓๐๕๒	๕,๔๑๘.๑๑๕๔	๒,๒๔๔.๑๘๙๘	๘๗๑	๓๑๕
รวม	๑,๑๘๖	๗,๖๖๒.๓๐๕๒	๑,๑๘๖	๗,๖๖๒.๓๐๕๒	๕,๔๑๘.๑๑๕๔	๒,๒๔๔.๑๘๙๘	๘๗๑	๓๑๕

★ **แผน/ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนเบิกจ่าย ๖๓	ลบ.	๑,๓๘๘.๕๒๓๕	๓,๒๖๙.๕๒๔๓	๕,๒๑๐.๓๖๘๗	๖,๓๕๔.๘๙๓๗	๗,๐๕๙.๒๘๑๔	๗,๕๖๖.๘๒๐๙	๗,๖๐๓.๗๔๓๓	๗,๖๔๘.๐๑๔๖	๗,๖๖๓.๑๒๓๒	๗,๖๖๓.๑๒๓๒	๗,๖๖๓.๑๒๓๒	๗,๖๖๒.๓๐๕๒
	%	๑๘.๑๒	๔๒.๖๗	๖๘.๐๐	๘๒.๙๔	๙๒.๑๓	๙๘.๗๕	๙๙.๒๔	๙๙.๘๑	๙๙.๙๘	๙๙.๙๘	๙๙.๙๘	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย ๖๓	ลบ.	๑,๓๘๘.๕๒๓๕	๓,๒๖๗.๒๙๐๓	๕,๒๐๕.๙๘๘๙	๕,๔๑๘.๑๑๕๔								
	%	๑๘.๑๒	๔๒.๖๔	๖๗.๙๔	๗๐.๗๑								

★ **งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๓**

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๙๓ รายการ วงเงิน ๙๐๑.๙๗๐๐ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง : ลงนามครบทุกรายการ

งบประมาณที่ลงนาม วงเงิน ๗๖๐.๘๐๐๖ ลบ.

- ผลการเบิกจ่าย ๗๕๙.๘๘๓๖ลบ. (๙๙.๘๙%) คงเหลือ ๐.๘๑๙๔ ลบ.(๐.๑๑%)
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๙๓ รายการ (๑๐๐%)

ผอ.กผง.

★ แผน/ผลการเบิกจ่ายกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๓
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เดือน		ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓
แผนเบิกจ่าย ๖๒	ลบ.	๓๘,๙๔๗๖	๑๓๔,๗๙๔๔	๒๒๕,๙๘๑๑	๔๐๕,๔๑๙๑	๕๒๐,๑๐๓๑	๖๐๘,๖๖๔๙	๖๙๑,๑๙๘๗	๗๒๗,๖๓๖๗	๗๕๘,๓๑๓๑	๗๕๙,๙๘๓๖
	%	๕.๑๒	๑๗.๗๒	๒๙.๗๐	๕๓.๒๙	๖๘.๓๖	๘๐.๐๐	๙๐.๘๕	๙๕.๖๔	๙๙.๗๘	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย ๖๒	ลบ.	๓๘,๙๔๗๖	๙๑,๓๗๕๙	๑๖๐,๔๘๘๖	๒๔๓,๕๑๙๐	๔๓๖,๖๔๓๐	๕๐๔,๒๔๒๔	๕๘๖,๘๔๕๐	๖๗๓,๗๐๖๔	๖๗๓,๗๐๖๔	๗๕๙,๙๘๓๖
	%	๕.๑๒	๑๒.๐๑	๒๑.๐๙	๓๒.๐๑	๕๗.๓๙	๖๖.๒๘	๗๗.๑๔	๘๘.๕๕	๘๘.๕๕	๑๐๐

★ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ๒๕๖๓
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๓๓ รายการ วงเงิน ๓๑๒.๒๒๙๐ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง : ลงนามครบทุกรายการ

งปม.ที่ลงนาม ๓๐๒.๓๓๘๓ ลบ.

- ผลการเบิกจ่าย ๒๐๘.๗๕๕๓ ลบ.(๖๙.๐๕%) คงเหลือ ๙๓.๕๘๓๐ ลบ.(๓๐.๙๕%)
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒๘ รายการ (๘๔.๘๕%) คงเหลือ ๕ รายการ (๑๕.๑๕%)

★ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๓
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ ๒)

เดือน		ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓	ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔
แผนเบิกจ่าย ๖๒	ลบ.	๔,๙๙๘๙	๕,๙๑๘๓	๓๔,๒๙๕๙	๑๑๙,๖๓๒๒	๑๙๖,๓๓๓๗	๒๓๑,๖๐๖๖	๒๔๔,๗๙๗๙	๒๔๖,๗๒๘๓	๒๗๓,๗๒๘๓	๒๗๓,๗๒๘๓	๒๗๓,๗๒๘๓	๒๘๔,๓๕๘๓	๓๐๒,๓๓๘๓
	%	๑.๖๕	๑.๙๖	๑๑.๓๔	๓๙.๕๗	๖๔.๙๔	๗๖.๖๑	๘๐.๙๗	๘๑.๖๑	๙๐.๕๕	๙๐.๕๕	๙๐.๕๕	๙๔.๐๕	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย ๖๒	ลบ.	๖,๔๗๑๙	๙,๐๙๔๑	๔๔,๕๕๘๗	๖๙,๔๒๒๑	๑๓๙,๑๑๗๕	๒๐๒,๖๖๗๓	๒๐๘,๗๕๕๓						
	%	๒.๑๔	๓.๐๑	๑๔.๗๓	๒๒.๙๖	๔๖.๐๑	๖๕.๐๓	๖๙.๐๕						

★ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๓
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน
จำนวน ๒ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๗,๒๑๗๔ ลบ.

๑. โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (RFB)

เป็นเงิน ๖๐๖.๐๗๗๖ ลบ.

๑.๑ ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ จำนวน ๘ แห่ง

วงเงิน ๒๓๙.๘๗๔๘ ลบ. เบิกจ่าย ๔๔.๐๖๑๑ ลบ. (๑๘.๓๙%)

๑.๒ แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต จำนวน ๒๓ แห่ง

วงเงิน ๓๖๔.๔๙๙๒ ลบ.

๒. โครงการติดตั้งหลักนำทางยางธรรมชาติ (RGP) ๗๖ แห่ง

จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ หลักร วงเงิน ๔๔๔.๐๐๑๑ ลบ.

ผอ.กผง.

★ การบริหารงบประมาณตามแผนงานใน พ.ร.บ.

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อสั่งการ รวค.

ขั้นตอน ส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนลงนามในสัญญา

ครั้งที่	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณปี ๖๔ (ล้านบาท)	สถานะ	หมายเหตุ
๑	๒๖๓	๑,๐๖๓.๓๕๖๔	รวค.ทราบแล้ว	-
๒	๒๕๗	๑,๐๗๐.๔๗๐๖	รวค.ทราบแล้ว	-
๓	๖๒๕	๔,๑๘๑.๔๖๒๑	รวค.ทราบแล้ว	-
๔	๑,๑๑๓	๘,๙๓๙.๑๐๑๖	รอ รวค.ทราบ	ส่ง คค. วันที่ ๑๒ ม.ค.๖๓
รวม	๒,๒๕๘	๑๕,๒๕๔.๙๓๐๗		

อทช.

ขอสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่รายงานสถานภาพจำนวน ๒๑ รายการ พอจะทราบหรือไม่ว่าส่วนใหญ่เป็นงบผูกพันของ สกท. สกส. หรือว่าเป็นงบปีเดียวอยู่ ราคากลาง ๔๖ รายการ สรรวจออกแบบ ๑๖ รายการ ยังไม่รายงานสถานภาพ ๒๑ รายการ

ผอ.กผง.

ขอชี้แจง รายการที่ยังไม่รายงานสถานภาพ ส่วนใหญ่จะเป็นของ สกท สกส. สคก. สว. เมื่อดูตามรายงานสถานภาพก็จะเห็นโครงการว่าอยู่ในสถานะ ๑ ก็คือ สถานะที่อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ สำนักที่ค้างอยู่สถานะ ๑ ก็จะมี สกส. ๑๑ รายการ สถานะที่ ๒ คือสถานะที่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง สำนักที่ค้างอยู่สถานะ ๒ ก็จะมี สกท. สคก. สปร. ที่เยอะหน่อยจะอยู่ที่บุรีรัมย์ ๑๖ รายการ เพชรบุรี ๔ รายการ เป็นต้น

อทช.

ขอสอบถาม จังหวัดระยองที่ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๕ รายการ มีปัญหาอะไรหรือไม่

ผส.ทช.ที่ ๓

ขอชี้แจง ข้อมูลอยู่ระหว่างร่าง TOR

อทช.

ยังมีที่ สระบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ฝาก ฝากเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้ ผส.เร่งรัดในส่วนนี้ด้วย ในส่วนของเงินกันเหลื่อมปีต้องให้หมดก่อน ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้ว ๕,๔๑๘.๑๑๕๔ ล้านบาท คงเหลือ ๒,๒๔๔.๑๘๘๘ ล้านบาท รายการที่แล้วเสร็จ ๘๗๑ รายการ คงเหลือ ๓๑๕ รายการ ตั้งแต่ไตรมาสแรก มีโครงการปีเดียวรายการไหนที่จะยาวถึงไตรมาส ๒ หรือไม่

ผอ.กผง.

ขอชี้แจง เรื่องเงินกันเหลื่อมปีจะมีระยะเวลา ๖ เดือน พอถึงเดือนมีนาคมก็จะมี การสอบถามเข้ามาว่าดำเนินการไปถึงไหน เราควรจะทำให้ได้ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ หรือเกือบหมด ส่วนรายการปีเดียวในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ น่าจะทำการเบิกจ่ายหมดเพราะว่ามาตั้งแต่ปีที่แล้ว

อทช.

ขอฝาก สปร.ประสานทำเรื่องแบบและราคาให้พร้อม เพราะถ้าอนุมัติมาแล้วจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย อย่างน้อยก็ต้องไปชี้แจงกับทางสำนักงบประมาณเหมือนเดิม สำนักงบประมาณจะมาเยี่ยม ทช.เมื่อไหร่

ผอ.กผง.

สำนักงบประมาณได้แจ้งมาครั้งแรกคือวันวันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ได้ขอเลื่อนเป็นวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ คาดว่าผู้อำนวยการสำนักงบประมาณคนใหม่จะเดินทางมาด้วย

๓.๒ มาตราการเร่งรัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔

ความเป็นมา

๑. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และมอบหมายให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติ ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบรายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ภาพรวม	32	54	77	100
รายจ่ายลงทุน	20	45	65	100
รายจ่ายประจำ	36	57	80	100

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน คค. ให้ทุกหน่วยรีบงบประมาณ ปรับแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

กรมทางหลวงชนบทก็ได้ทำหนังสือเพื่อจะชักชวนมาตรการจากนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้
แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยได้รับทราบเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

[illegible]

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔กรมทางหลวงชนบท

รายการ	วงเงินงบประมาณ	แบ่งงวดงานให้ เชื้อดอการ เร่งรัดเบิกจ่าย	เบิกเงิน ล่วงหน้า 15 %	เบิกจ่าย ร้อยละ 100 ภายใน ส.ค. 64	การส่งมอบงาน
งบผูกพัน	ผูกพันเดิมทั้งหมด	-	-	✓	อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
	ผูกพันใหม่ทั้งหมด	✓	✓	✓	อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
งบปีเดียว	ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป	✓	✓	✓	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง (อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
	ตั้งแต่ 5 ลบ. ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ลบ.	✓	-	✓	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง (อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
	ต่ำกว่า 5 ลบ.	-	-	✓	1 ครั้ง หรือมากกว่าตามความ เหมาะสม

ผอ.กผง.

๑. รายการก่อสร้างปีเดียว ขอให้ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒. รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๓. รายการก่อสร้างผูกพันเดิม ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี โดยเร่งด่วน และเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (กรณีเงินกันเหลื่อมปี หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เงินจะตกหายไป)
๔. รายการก่อสร้างผูกพันใหม่ ขอให้มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% และให้เร่งรัดการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๕. งานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป ขอให้แบ่งงวดให้เอื้อต่อการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส และขอความร่วมมือให้มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % (กรณีไม่มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้มีการเบิกจ่ายโดยเร็ว) โดยเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง อย่างน้อยควรมีการเบิกจ่ายไตรมาสละ ๑ ครั้ง
๖. งานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณ ๕ - ๑๐ ล้านบาท ขอให้แบ่งงวดให้เอื้อต่อการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส โดยเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง อย่างน้อยควรมีการเบิกจ่ายไตรมาสละ ๑ ครั้ง

รทช.(ประศักดิ์ฯ)

การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง อยากให้มีการส่งงานก่อน เช่น งานลูกจ้าง/หินคลุก และอยากให้ลงพื้นที่ไปดูหน้างานบ้าง เพราะช่วงหลังมีเรื่องร้องเรียนเนื่องจากสร้างแล้วพังในระยะเวลาสั้น อาจเป็นเพราะเราเร่งรัดการทำงานหรือไม่ส่งงาน ก็ยังไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกสัญญาในงบปีเดียวของส่วนภูมิภาคให้การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง

วศญ.(นายวิศว์ฯ)

การเบิกจ่าย ๑๕% ที่ ผอ.กผง. กล่าวข้างต้น ปัญหาของพวกเราก็คือผู้รับจ้างไม่พร้อมที่จะเบิกจ่าย ดังนั้นเราจะใช้วิธีแก้โดยพิจารณาแบ่งงวดให้ดี บางรายการสามารถดำเนินการตั้งแต่ต้นงวด เช่น ถ้าเป็นงานก่อสร้างใหญ่ ๆ ปริมาณวัสดุมีจำนวนมากเขาจะส่งวัสดุก่อนแต่ยังไม่ติดตั้ง เราก็พิจารณาเบิกจ่ายค่าวัสดุก่อน แล้วค้างงานติดตั้งเอาไว้เบิกจ่ายอีกงวดหนึ่ง พิจารณาเป็นรายโครงการไป ใช้วิธีการเดิม ๆ ไม่ได้แล้ว ยกเว้นหากเราจากกับผู้รับจ้างได้ ๑๕% เพราะกรมฯ มีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายตามแผนที่ได้มีนโยบายไว้

รทช.(นายไกรวัลย์ฯ)

การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรมฯ ได้แจ้งไป แต่ละหน่วยพยายามดูรายละเอียด เพราะว่าปีที่ผ่านมาบางหน่วยวางแผนไว้สูง แต่เบิกจ่ายได้น้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางกองแผนงานที่จะต้องรายงานไปที่กระทรวงฯ เพราะฉะนั้นก็ฝากทางหัวหน้าหน่วยดูเป้าหมายที่กรมฯ ตั้งไว้ด้วย

รทช.(นายประศักดิ์ฯ)

ตามตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ขั้นตอนที่ ๑ คงค้างอยู่ ๑๖ โครงการ คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะดำเนินการแล้วเสร็จ การประมาณราคากลาง ยังไม่แล้วเสร็จ ๔๖ โครงการ ถ้ารวม อีก ๑๖ โครงการ จะเป็น ๖๒ โครงการ ก็ฝากทาง ผู้อำนวยการสำนักส่วนภูมิภาค และแขวงทางหลวงชนบทด้วยว่าในสัปดาห์นี้เร่งดำเนินการให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เข้าสู่ขั้นตอน TOR สัญญาใดที่ลงนามแล้วก็อย่าลืมเรื่องเปิด PO ไว้ด้วย

เมื่อ ๒ สัปดาห์ก่อน สำนักบริหารกลางแจ้งเวียนระเบียบกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับเรื่องหนังสือการค้าประกัน ก็ประสานภายในและวางแผนได้ สัญญาใดลงนามวันไหน แล้วแจ้งทางผู้ประกอบการไปดำเนินการควบคุม และจะมีหนังสือแจ้งอีกฉบับหนึ่ง

ผส.บก

เรื่องที่สำคัญบริหารกลางได้แจ้งเวียนไปคือการมอบอำนาจในเรื่องของค่า k ต่อไปนี้ทางหน่วยจะต้องรับผิดชอบเอง รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมหนังสือ

เรื่องรายการผูกพันเดิม หากดูรายละเอียดแนบมา ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ จะเห็นว่าเงินอีก ๗๕๗ ล้านบาท ที่ยังไม่ทำ PO แต่ละหน่วยควรจะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ว่าทำได้ทำ PO ครบหรือไม่ ส่วนนี้จะมีผลต่อการก่อหนี้ของกรมฯ

รายการเงินกันเหลื่อมปีที่ ผอ.กผง. แจ้งว่าเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ต้องเบิกให้หมด ตอนนี้มีหลายรายการที่เรายังไม่มีหนี้ ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมาก ถ้าหาก ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ไม่มีหนี้ก็จะตกปั๊บแน่นอน เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเร่งรัด

รทช.(นายประศักดิ์ฯ)

ตามที่ท่าน ผส.บก. ได้แจ้งเป็นตัวเลขที่ ผส.ทช. ที่ ๑ - ๑๘ และสำนักส่วนกลางต้องกำกับเอง หมั่นเรียกดูการเคลื่อนตัวข้อมูล PO, การออกแบบ และการประมาณราคาของหน่วยงานในกำกับ เมื่อเข้าสู่ TOR จะทำอะไรไม่ได้แล้ว ช่วงนี้ฝากทาง ผส.ทช. และ ผอ.ขทช. ช่วยกำกับดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วย

ผส.ทช.ที่ ๑๘

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๘ การจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นไปตามแผน คาดว่าไม่เกิน วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ก็จะทราบผลการประกวดราคาทุกรายการ และพร้อมลงนามสัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ สัญญาทุกรายการไม่เกิน ๑๘๐ วัน เพราะฉะนั้นไม่เกินเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด

ผส.ทช.ที่ ๑๗

ขอชี้แจง ตอนนี้มีมีการประกาศประกวดราคา ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒ รายการ เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา ซึ่งจะทราบผลในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผน ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

วศย.(นายวิศว์ฯ)

ให้สำนักบริหารกลางช่วยทบทวนหนังสือแจ้งเรื่องการประกวดราคาครั้งที่ ๒ ว่ามีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรให้แต่ละหน่วยด้วย

ผส.บก

ปีที่แล้วได้ชักซ้อมไปแล้ว ปีนี้จะส่งให้อีกครั้ง ซึ่งเป็นแนวทางการประกาศฯ ครั้งที่ ๑ ไปสู่ผู้รับจ้าง แล้วต้องดำเนินการอย่างไรต่อ

ผส.ทช.ที่ ๑๖

ขอชี้แจง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ก็จะมีอยู่ ๓ รายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างรอบ ๒ คาดว่าจะทราบผลในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ในส่วนอีก ๑ รายการที่จังหวัดนครพนมจะจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จะทราบผลภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ส่วนของจังหวัดมุกดาหารอยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ โดยจะร่าง TOR ภายในอาทิตย์นี้ และจะทราบผลภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผส.ทช.ที่ ๑๕

ขอชี้แจง ลงนามในสัญญาไปแล้ว ๔ รายการ ส่วนที่เหลือรอลงนามในสัญญา และงบบุผูกพันปี ๒๕๖๔ มี ๒ รายการ ซึ่งยังรองบประมาณปี ๒๕๖๔ งวดต่อไป

ผส.ทช.ที่ ๑๔

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๔ อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/ประมาณราคา ๑ รายการ เป็นงบบุผูกพัน (งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย) งบประมาณ ๙,๕๕๗,๐๐๐ บาท และงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๙ ล้านบาท ถ้าประกาศราคากลางวันที่ ๒๕ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ ๒๙ มกราคม - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเสนอราคาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยจะทราบผลวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นรายการสุดท้าย ในส่วน ขทช.พังงา ๑ รายการ จะทราบผลวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และ ขทช.ภูเก็ต ๑ รายการ จะทราบผลวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

<u>ผส.ทช.ที่ ๑๔</u>	ในส่วนของที่ร่างประกาศ ขั้นตอนที่ ๓ กับช่องที่ ๔ โดยรวมแล้วส่วนใหญ่เป็นรายการที่ประกาศครั้งที่ ๒ จะทราบผลประมาณปลายเดือนมกราคม – ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
<u>ผส.ทช.ที่ ๑๓</u>	ขอชี้แจง สทช.ที่ ๑๓ จำนวน ๒๑๐ รายการ ยังไม่ทราบผล ๑๘ รายการ คาดว่าจะทราบผลทั้งหมดภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ และจะลงนามปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในส่วนอีก ๑ รายการ อยู่ขึ้นในขั้นตอนการร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะทราบผลภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
<u>รทช.(นายประศักดิ์)</u>	สทช.ที่ ๑๒ , ๑๑ และ สทช.ที่ ๑๐ สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่คาดการณ์ไว้
<u>ผส.ทช.ที่ ๙</u>	ขอชี้แจง จังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะนี้ประกาศประกวดราคากลาง จำนวน ๑ รายการ จะทราบผลประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่วนราคากลางดำเนินการไปแล้ว ๑ รายการ เป็นโรงซ่อมเครื่องจักร คาดว่าจะลงระบบร่างประกาศฯ ได้ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ จะทราบผลประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และงานปรับปรุงแบบอีก ๑ รายการ ที่ต้องแก้ไขแบบใหม่ พอสำรวจใหม่ปรากฏว่าติดประปาหมู่บ้านและกำแพงคอนกรีตที่สร้างใหม่ ซึ่งดำเนินการออกแบบใหม่เรียบร้อยแล้ว จะประมาณราคาแบบ และประกาศประกวดราคากลางภายในสัปดาห์นี้
<u>ผส.ทช.ที่ ๘</u>	ขอชี้แจง จากการสอบถาม ขทช.กำแพงเพชร ก็จะมีการสรุปราคาภายในวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ และล่าสุดจะมี ๑ รายการที่จะได้ผู้เสนอราคาในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่วนของ ขทช.อุทัยธานี จะมีการสรุปราคาและผู้เสนอราคาในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ยืนยันว่าจะดำเนินการตามแผนที่คาดการณ์ไว้
<u>รทช.(นายประศักดิ์)</u>	สทช.ที่ ๗ สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่คาดการณ์ไว้
<u>ผส.ทช.ที่ ๖</u>	ขทช.เลย จำนวน ๔ รายการ เป็นงานยกระดับ จะดำเนินการร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในสัปดาห์นี้ และจะทราบผลภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
<u>ผส.ทช.ที่ ๕</u>	ขอชี้แจง สทช.ที่ ๕ สถานะเบิกจ่ายยังเหลือ ขทช.บุรีรัมย์ จากระบบของกรมฯ อยู่ขั้นตอนที่ ๒ ราคากลางจำนวน ๑๖ รายการ แต่ ณ ปัจจุบันสอบถามจาก ผอ.ขทช.บุรีรัมย์ ว่ามี ๙ รายการได้ประกาศไปเรียบร้อยแล้วในวันนี้ และอีก ๗ รายการที่จะเข้าขั้นตอนร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างในอีก ๓ วัน
<u>ผส.ทช.ที่ ๔</u>	ขอชี้แจง สทช.ที่ ๔ เป็นรายการที่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงนี้จึงมีการชะลอการดำเนินงาน ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะเร่งดำเนินการโดยเร็ว และ ขทช.สมุทรสาคร อีก ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเร่งดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
<u>รทช.(นายประศักดิ์)</u>	สทช.ที่ ๓ และ สทช.ที่ ๒ สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่คาดการณ์ไว้
<u>ผอ.ขทช.นนทบุรี</u>	ขอชี้แจง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ ๔ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว จะทราบผลในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
<u>รทช.(นายประศักดิ์)</u>	ภาพรวมของ สทช.ที่ ๑ - ๑๘ จะเห็นได้ว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผน ส่วนสัญญาที่ยังไม่เรียบร้อย ในส่วนของส่วนกลางให้ทางกองแผนงานกำกับในส่วนนั้น
<u>ผอ.กผง.</u>	ในส่วนของสำนักส่วนกลาง ท่านอธิบดีได้มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยตรง และมีการรายงานให้ท่านอธิบดีทราบอยู่แล้ว
<u>รทช.(นายประศักดิ์)</u>	ของสำนักก่อสร้างทางต้องรอสำรวจออกแบบอย่างเดียวใช้หรือไม่

ผส.ภท.

ขอชี้แจง ปัจจุบันได้รับข้อมูลมาเกือบครบหมดแล้ว อาจจะมีการประสานรายละเอียดบ้างในช่วงทำราคากลาง แต่เนื่องด้วยยังไม่ได้ลงระบบ ปัจจุบันราคากลางที่เสร็จแล้วประมาณ ๓ รายการ อนุมัติเรียบร้อยแล้วก็คงเหลือขั้นตอนร่างประกาศฯ ส่วนที่เหลือกำลังทำราคากลาง จะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้

ผส.บก

สำหรับรายการผูกพัน ตามเอกสารในส่วนของภูมิภาค ขณะนี้ยังเหลือ ๒ หน่วยที่ยังไม่ส่งเอกสารราคากลางให้กับสำนักบริหารกลางเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ได้แก่ ขทช.พังงา (อาคาร ๔ ชั้น) และ สทช.ที่ ๔ มี ๒ รายการ (ถนนสาย ปช. ๔๐๐๗ และสะพานข้ามห้วยกะเหรี่ยงคู่) กรุณาส่งเอกสารให้สำนักบริหารกลางด้วย

ผอ.ขทช.พังงา

ขอชี้แจง ขทช.พังงา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ และจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลได้ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔

ผส.ทช.ที่ ๔

ขอชี้แจง สทช.ที่ ๔ คาดว่าจะทราบราคาภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อทราบราคาแล้วจะเร่งดำเนินการส่งข้อมูลให้ทางสำนักบริหารกลาง

ผอ.ภผง.

แจ้งรายการที่ ผส.ทช.ที่ ๑๕ กล่าวเรื่องงบบุคลากรปี ๒๕๖๔ เท่าที่ได้ประสานกับสำนักงบประมาณ คือเขาจะเทเงินงวดมา ไม่ว่าจะเป็นรายการปีเดียว/ผูกพันเดิมต่าง ๆ เงินก็ทยอยมา เขาจะเทเงินงวดให้มาหมดแล้ว เพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาของ สทช.ที่ ๑๕ ที่บอกว่าถ้างานก่อสร้างเสร็จก็จะได้เงิน ผมคิดว่าไม่นาน เพราะเขาก็เคยพูดมาแล้วว่าเขาจะให้เงินงวดมาทั้งหมดในกรณีเงินผูกพันเดิม

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบทุกหน่วยงานดำเนินการ

๑. กำกับ - ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมฯ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล
๒. Update ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๓. หากหน่วยงานใดเกิดปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ประสาน รทช. และ วสญ. ในกำกับ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๔ เรื่อง


เรื่องที่ ๑

นายสันติภาพฯ

ผอ.ภพจ.สอป.

๔.๑ สรุปอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ และการวิเคราะห์เชิงลึก

สอป.ขอรายงานการสรุปอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ การวิเคราะห์เชิงลึก ดังนี้

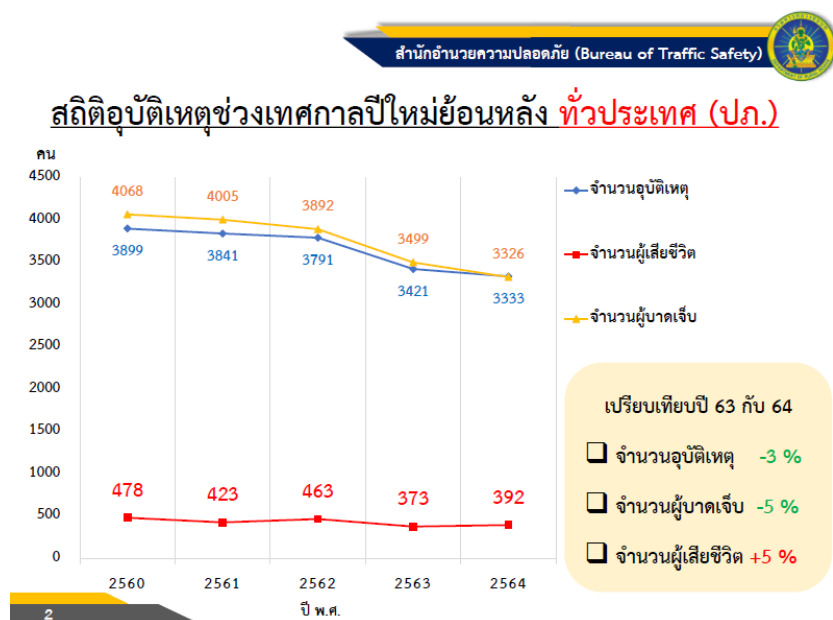


นายสันติภาพฯ
ผอ.ภพจ.สอป.


สำนักงานความปลอดภัย (Bureau of Traffic Safety)



สถิติอุบัติเหตุย้อนหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ของ ทช.

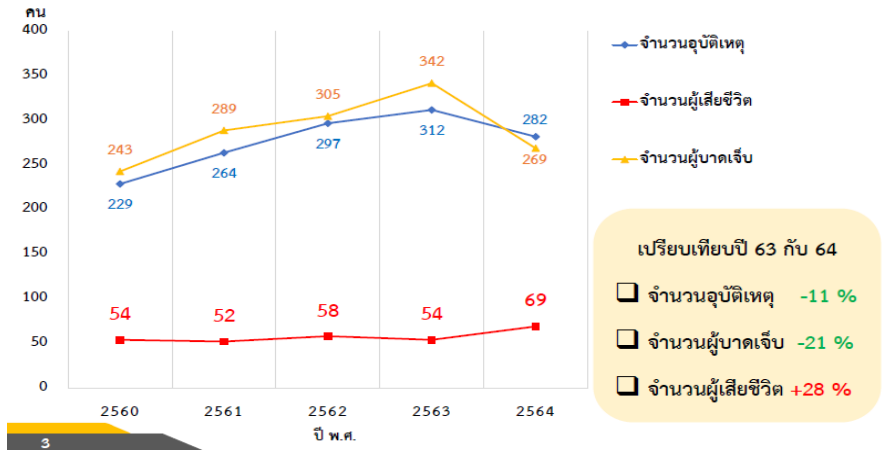


สาเหตุหลักของอุบัติเหตุ (ทช.)

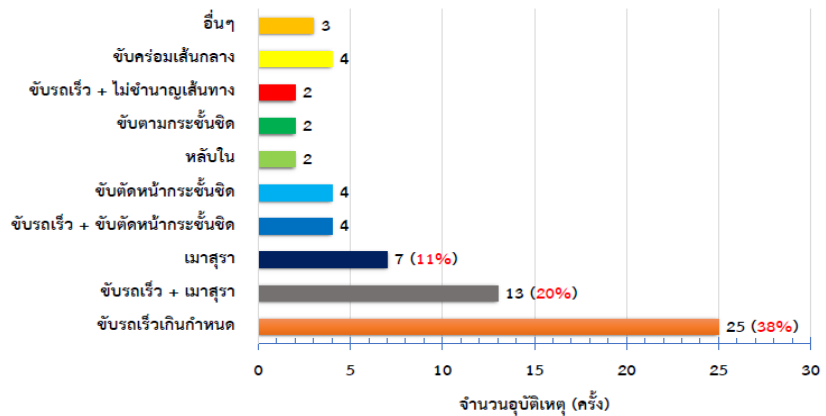

สำนักงานความปลอดภัย (Bureau of Traffic Safety)



เปรียบเทียบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุปีใหม่ 63 กับปีใหม่ 64

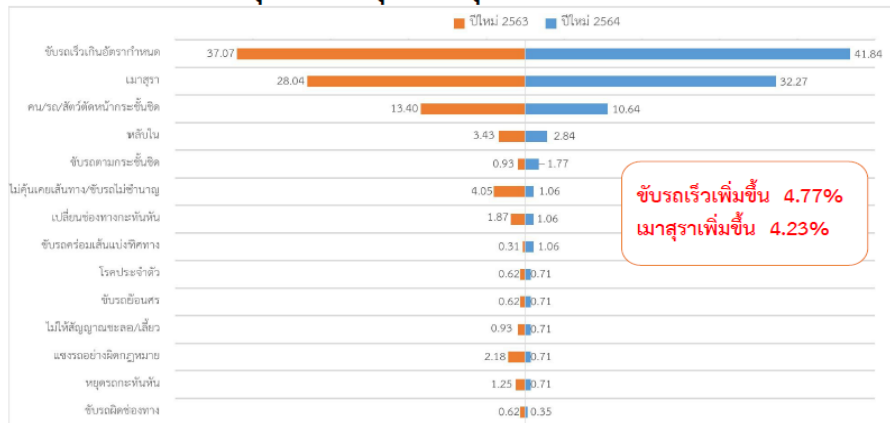


นายสันติภาพฯ
ผอ.ภพจ.สอป.

สำนักงานความปลอดภัย (Bureau of Traffic Safety)



ความหนาแน่นสะสมของจุดเกิดอุบัติเหตุ (29 ธ.ค. 63 – 4 ม.ค. 64)

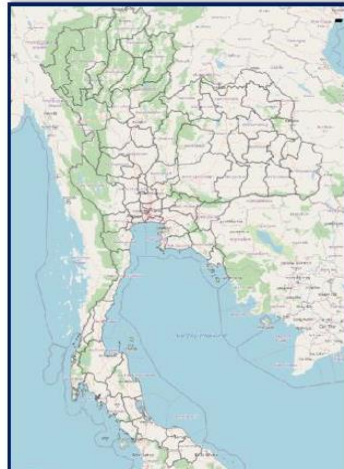

6


ข้อสังเกตจากการวิเคราะห์ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ๖๔

- * อุบัติเหตุที่เกิดจากขับรถเร็ว และเมาสุรามีจำนวนมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ลดลง โดยข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๖๔ มีการดำเนินคดีดื่มแล้วขับลดลง ๕๘.๐๕% คดีใช้ความเร็วเกินอัตราที่กำหนดลดลง ๖๗.๘๙% เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๖๓ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้อุบัติเหตุมีความรุนแรงมากขึ้น
- * ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๖๔ มีการกระจายตัวของอุบัติเหตุไปทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงเริ่มเทศกาลวันแรก อาจเป็นเพราะประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาก่อนช่วงเทศกาล
- * การจัดงานฉลองเมศกาลปี ๖๔ ตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่จะสังสรรค์อยู่ในชุมชน ซึ่งทำให้มีการใช้ถนนสายรอง และถนนภายในชุมชนมากขึ้น จึงอาจทำให้อุบัติเหตุที่รุนแรงจากการดื่มแล้วขับในถนนสายรองมีจำนวนมากขึ้น

สำนักงานความปลอดภัย (Bureau of Traffic Safety)



การวิเคราะห์กรณีอุบัติเหตุรุนแรง (กรณีมีผู้เสียชีวิต)

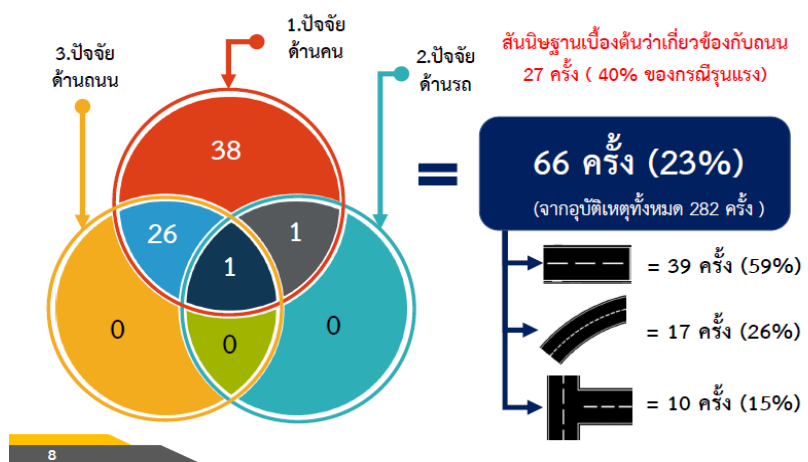



นายสันติภาพฯ
ผอ.ภพจ.สอป.

การลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยภาคสนาม

จากอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตเกิดบน ๖๖ สายทาง (ผู้เสียชีวิต ๖๙ ราย) สอป. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยสายทางที่คาดว่าจะมีสาเหตุจากถนน จำนวน ๕ สายทาง โดยจะนำเสนอ ๒ สายทาง ดังนี้

๑. ชน.๑๐๑๕ (กม.ที่ ๑๔+๐๐๐) แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ๑ (กม.ที่ ๒๗๔+๐๓๐) –

แยกทางหลวงหมายเลข ๑ (กม.ที่ ๒๙๗+๔๙๔) อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

ผู้ขับขี่รถยนต์จักรยานยนต์ (บิ๊กไบค์) ขับขี่มาด้วยความเร็วสูงแล้วเสียหลักพลิกคว่ำตกถนน จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เสียชีวิต ๒ ราย

เกิดอุบัติเหตุ ๑ ม.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๔.๐๕ น.

สภาพอากาศ กลางคืน แจ่มใส,ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง

สถานที่เกิดเหตุ ทางโค้งกลับทิศศรศมีมีกว้าง ถนน ๒ ช่องจราจร,ไหล่ทาง ๑ ม.

มูลเหตุสันนิษฐาน คน : ขับรถด้วยความเร็ว

รถ : ไม่มีมูลเหตุสันนิษฐาน



ชน.๑๐๑๕ (กม.ที่ ๑๔+๐๐๐)

มีลักษณะทางกายภาพ เป็นถนน ๒ ช่องจราจร กว้างช่องละ ๓ เมตร ไหล่ทาง ๑ เมตร ทางโค้งกลับทิศศรศมี ๓๒๗ และ ๕๐๐ เมตร ไม่มีการยกโค้ง ความเร็วปลอดภัยในการเข้าโค้ง ๕๐ และ ๖๐ กม./ชม.

ประเด็นปัญหา มีเศษวัสดุอยู่บนผิวจราจร ไม่มีอุปกรณ์นำทาง/ป้ายจราจร เส้นจราจรไม่ชัดเจน

• ข้อมูลอุปกรณ์อำนวยความสะดวก



ประเด็นการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ เทียบกับ ค่ามาตรฐาน
1. ค่าสะท้อนแสงเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	
1.1 เส้นขาว-เหลือง (กลางวัน)	ผ่าน
1.2 เส้นขาว-เหลือง (กลางคืน)	ไม่ผ่าน
2. ค่าสะท้อนแสงป้ายจราจร	ไม่มีป้ายจราจร
3. ค่าความต้านทานการลื่นไถล	ผ่าน



นายสันติภาพฯ
ผอ.กพจ.สอป.

แนวทางการปรับปรุงความปลอดภัย
ระยะสั้น

๑. ติดตั้งป้ายจราจร
๒. ปรับปรุงผิวจราจร หรือกำจัดเศษวัสดุบนผิวจราจร
๓. ปรับปรุงเส้นจราจร
๔. ติดตั้งหลักนำทางยางพารา
๕. เพิ่ม Clear Zone / กำจัดสิ่งอันตรายข้างทาง

ระยะยาว

๑. ปรับแนว Alignment ให้เป็นทางตรง



๒. พช.๔๐๑๔ (กม.ที่ ๒+๘๓๐) แยกทช. พช.๖๐๔๖ (กม.ที่ ๖+๓๐๐) – บ้านดงมูลเหล็ก
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
รถจักรยานยนต์ขับขึ้นจากปลายทางมุ่งหน้าเดินทางด้วยความเร็วสูง เมื่อถึงจุดเกิดเหตุเป็นทาง
โค้งขวา ได้เสียหลักหลุดโค้งตกถนนชนเสาไฟฟ้า จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
เสียชีวิต ๑ ราย

เกิดอุบัติเหตุ

๑ ม.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น.

สภาพอากาศ

กลางคืน มีไฟฟ้าแสงสว่าง


สถานที่เกิดเหตุ

ทางโค้ง ถนน ๒ ช่องจราจร, ไหล่ทาง ๑ ม.

มูลเหตุสันนิษฐาน

คน : ขับรถด้วยความเร็ว, ไม่สวมหมวกนิรภัย

รถ : ไม่มีมูลเหตุสันนิษฐาน

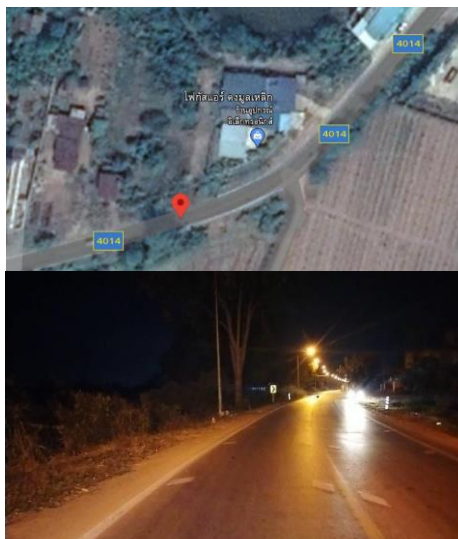

นายสันติภาพฯ

ผอ.กพจ.สอป.

พช.๔๐๑๔ (กม.ที่ ๒+๘๓๐)

มีลักษณะทางกายภาพ เป็นถนน ๒ ช่องจราจร กว้างช่องละ ๓ เมตร ไหล่ทาง ๑ เมตร ทางโค้ง รัศมี ๑๒๑ เมตร ไม่มีการยกโค้ง ความเร็วปลอดภัยในการเข้าโค้ง ๔๐ กม./ชม.

ประเด็นปัญหา มีทางเชื่อมบริเวณทางโค้ง ไม่มีการยกโค้ง มี Clear Zone ต่ำ/มีสิ่งอันตรายข้างทาง ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเฉลี่ยก่อนเข้าโค้งค่อนข้างสูง (๕๕.๔ กม./ชม.)

• ข้อมูลอุปกรณ์อำนวยความสะดวก



ประเด็นการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ เทียบกับ ค่ามาตรฐาน
1. ค่าสะท้อนแสงเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	
1.1 เส้นขาว-เหลือง (กลางวัน)	ผ่าน
1.2 เส้นขาว-เหลือง (กลางคืน)	ไม่ผ่าน
2. ค่าสะท้อนแสงป้ายจราจร	ผ่าน
3. ค่าความต้านทานการลื่นไถล	ผ่าน



แนวทางการปรับปรุงความปลอดภัย

ระยะสั้น

๑. ติดตั้ง Guardrail สำหรับ จยย. และ end terminal
๒. ติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติม
๓. ปรับปรุงเส้นจราจร/เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
๔. กำจัดสิ่งอันตรายข้างทาง

ระยะยาว

๑. เพิ่มรัศมีโค้ง และยกโค้ง ปรับระดับทางเชื่อม ($R = ๑๓๕$ ม. $E = ๖\%$ $v = ๕๐$ /กม.ชม.)



รทช.(นายประศักดิ์ฯ)

ขอสอบถาม สอป.ว่า ได้ทำหนังสือแจ้งทุกสำนักที่เกิดอุบัติเหตุและแจ้งผลให้ไปปรับปรุงหรือยัง

ผส.อป.

ยังไม่ได้แจ้ง เพราะทางเราเพิ่งจะสำรวจและสรุปเสร็จ นำเสนอมาให้ที่ประชุมทราบเบื้องต้นก่อน ซึ่งพอเสร็จแล้วทางเราจะแจ้งไปทางสำนักว่า จะต้องทำอะไรบ้าง ทั้งนี้อยากจะฝากแขวงว่าให้ดูเรื่องกายภาพของถนนเป็นเรื่องหลัก อย่างที่ที่ทางเราวิเคราะห์มา จริง ๆ แล้วอุบัติเหตุถึงจะใส่อุปกรณ์เอาไปถ้าไค้ไม่ได้ยังไ้ไม่ได้ ในหลังการครวที่จะมองในกายภาพของถนนก่อน หลังจากนั้นค่อยเอาอุปกรณ์มาใส่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย แต่ถ้าเรานำอุปกรณ์มาใส่ก่อนยังไ้ก็ไม่ปลอดภัย ทั้ง ๒ เคส ทางเรานำมาให้ดูและวิจารณ์ด้วย อาจจะมีผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าทางทีมงาน ก็ยินดีรับข้อเสนอแนะ ทางเราจะรับฟังและนำเอาแนวทางวิธีการของทุกท่านไปปรับปรุงและนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไป

รทช.(นายประศักดิ์ฯ)

นั่นหมายถึงว่าตอนนี้ทุกหน่วยรู้แล้วว่าสายทางของของตัวเองเกิดอุบัติเหตุจุดนั้น ลงพื้นที่รีบไปสำรวจออกแบบขึ้นรูปแล้วส่งมาที่ สอป. เพื่อของบประมาณไปแก้กายภาพเรื่องผิวทางก็ให้นำเสนอมา ทั้งนี้ สอป.ก็ไม่ต้องแจ้งผลตัวนี้ไปให้เพราะทุกคนรู้แล้วก็ให้รีบทำมาเลยภายในเมื่อไหร่

ผส.อป.

โดยหลักการทาง สอป.จะดูเรื่องของเคสที่เกิดอุบัติเหตุความรุนแรงทำให้เสียชีวิต ซึ่งทางเราจะต้องไปวิเคราะห์กันว่าจริง ๆ แล้ว เกิดจากอะไร ถ้าเราไปสำรวจเองจะต้องมีแบบการแก้ไขเอง ตรงนี้ทางเราตั้งงบประมาณเอง และก็มีมอบให้แขวงไปดำเนินการตามที่ทางเราออกแบบไว้ ส่วนในกรณีอื่น ๆ ถ้าแขวงมีความต้องการที่จะตั้งงบประมาณก็ให้ไปสำรวจอย่างที่เราสารวจแล้วก็ทำงบประมาณเสนอเข้ามา นี่ก็เป็นอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้แขวงเองจะทราบว่าอุบัติเหตุเกิดที่ไหนอย่างไร เพราะว่าทางแขวงเป็นผู้ลงระบบ ARMS ให้ทาง สอป. แขวงก็สามารถไปสำรวจทำเป็นรูปเล่มหรือทำเป็นแบบมานำเสนอเข้ามาที่ สอป. เพื่อที่จะพิจารณานำมาเข้าตั้งงบประมาณในปีถัดไป หรือถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนถ้าไม่มีโรมาทาง สอป.มีงบอำนวยการอยู่แล้ว ถ้ามีความที่ต้องการใช้งบประมาณสูงเราอาจจะใช้เงินเหลือจ่าย

รทช.(นายประศักดิ์ฯ)

ทุกหน่วยทราบแล้วว่าปีใหม่นี้ท่านมีจุดไหนที่เกิดอุบัติเหตุท่านต้องลงไปทำแบบแล้วส่งมาให้กับทาง สอป. อย่าถามเรื่องการกำหนดเวลา ขอให้ท่านช่วยทำให้เร็วที่สุด แต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นอีกไหม ถ้ามีโอกาสเกิดขึ้นขอให้ท่านดำเนินการด้วยงบประมาณที่ได้ก่อนเลย ส่วนที่ต้องใช้งบประมาณก้อนใหญ่ก็ขอให้ส่งมาที่ทาง สอป. พิจารณาจัดสรรออกไปให้ ฉะนั้นก็เป็นประเด็นได้ว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์จะต้องไม่เกิดซ้ำกับจุดเหตุตรงนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒

วศญ.(นายวิศว์ฯ)

๔.๒ เรื่องเจ้าพนักงานทางหลวง

ขอให้ทุกหน่วยเข้าไปดูว่าบัตรประจำตัวพนักงานทางหลวงของแต่ละท่านมีกันหรือยัง ถ้ามีแล้วบัตรหมดอายุหรือยังก็ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ส่วนชุดเจ้าพนักงานทางหลวงตอนนี้ทางเราได้มีประกาศของกระทรวงฯเกี่ยวกับชุดเจ้าพนักงานทางหลวงแล้ว ส่วนเรื่องสีชุด เครื่องหมาย ทางสวัสดิการกรมทางหลวงชนบทจะเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายต่อไป

รทช.(นายไกรวัลย์ฯ)

ขณะนี้สวัสดิการของกรมทางหลวงชนบทได้จัดตั้งคณะทำงานฯ ในแต่ละด้านไว้แล้ว เรื่องแรกที่จะดำเนินการจัดทำก็คือชุดเจ้าพนักงานทางหลวงเพื่อให้เป็นชุดเครื่องแบบที่มีสีเดียวกัน ได้มอบหมายให้ นายจอม ตีระวนิชย์ ผอ.กสท.สปร. เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งจะทำหนังสือแจ้งไปรวมทั้งเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วย และสวัสดิการของกรมทางหลวงชนบทจะได้ดำเนินการสั่งทำมาเตรียมจำหน่ายให้ทุกท่านต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๓

ผส.อป.

๔.๓ เรื่องการควบคุมงานไฟฟ้าแสงสว่าง

ตามที่ สอบ.ได้มีหนังสือแจ้งเวียนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การควบคุมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การควบคุมงาน กิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่บริเวณทางหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงฯ ในการนี้ จึงขอให้ สทช. และ ขทช.กำกับและเน้นย้ำนายช่างผู้ควบคุมงานดำเนินงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทหรือแบบก่อสร้างคู่สัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด เนื่องจากขณะนี้กรมฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าดับบ่อย จึงขอความร่วมมือ สทช.และขทช.ทุกหน่วยให้ช่วยดำเนินการควบคุมงานอย่างเคร่งครัดและให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมฯ ด้วย

รทช.(นายประศักดิ์ฯ)

ขอให้พวกเราครวที่จะใส่ใจการตรวจการจ้างงานไฟฟ้า ถ้ามีประเด็นในเรื่องของไฟดับก็ช่วยกันดูบ้าง

มติที่ประชุม

มอบ สทช.และขทช. กำกับและควบคุมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟจราจร ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกรมฯ อย่างเคร่งครัด

เรื่องที่ ๔

ผส.บก.

๔.๔ เรื่องแนวทางการดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

กรณีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ครั้งที่ ๑ แล้วไม่มีผู้เสนอราคา


ด้วยในปี ๒๕๖๓ สบก. ได้มีหนังสือเรื่องแนวทางการดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) กรณีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ครั้งที่ ๑ แล้วไม่มีผู้เสนอราคาโดยได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ สำหรับวันนี้ สบก.ขอชักชวนแนวทางการดำเนินงานกรณีดังกล่าว ดังนี้

กรณีที่ ๑. การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ครั้งที่ ๑ แล้ว ปรากฏมีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องเพียงรายเดียว กรณีเช่นนี้จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาผล ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการต่อ ซึ่งตามระเบียบกำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการต่อรองราคา และเสนอหัวหน้างานตามขั้นตอน

กรณีที่ ๒. การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ครั้งที่ ๑ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีผู้เสนอราคาแต่ไม่มีคุณสมบัติถูกต้อง ให้ดำเนินการ

- ไปทบทวนเกี่ยวกับราคาใหม่และประกาศฯ ใหม่ ครั้งที่ ๒

- ถ้าประกาศฯ ครั้งที่ ๒ แล้ว ปรากฏยังไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ให้เปลี่ยนวิธีการดำเนินการใหม่ และหากถ้ายังไม่ได้ผลให้เปลี่ยนเป็นวิธีการเจาะจง

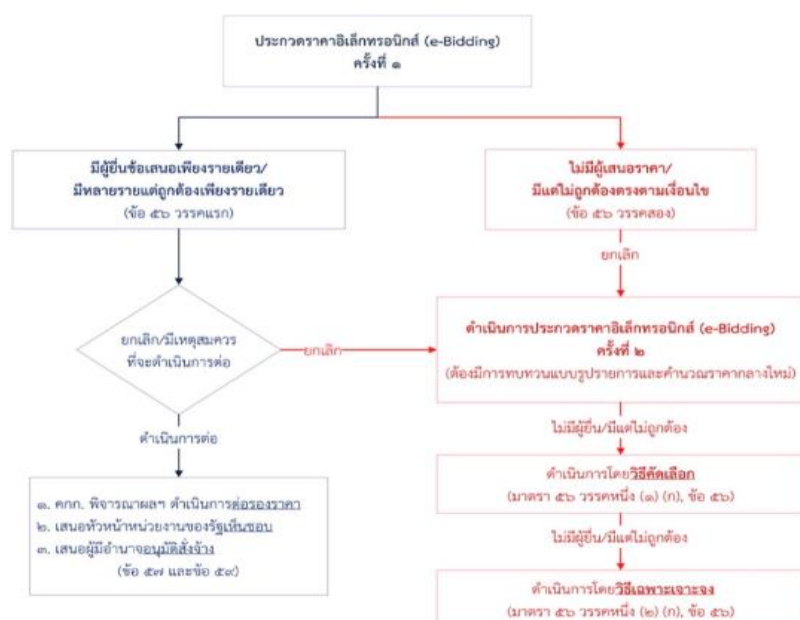


รทช.(นายประศักดิ์ฯ)

สรุปว่าเราจะ e-Bidding ครั้งที่ ๑ คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ถ้าไม่มั่นใจให้โทรประสานหารือกับ ผส.บก. ซึ่งจะดำเนินการโดยการเปิดครั้งที่ ๒ ก็ได้ หรือจะดำเนินการต่อไปก็ได้ ถ้าเปิดครั้งที่ ๒ ไม่ได้ผล จะไม่เปิด e-Bidding ครั้งที่ ๓ ถ้าวิธีการคัดเลือกไม่ได้ผล ก็จะไปวิธีการเจาะจง ดำเนินการตามนี้ก่อน มีข้อสงสัยในการดำเนินงานอย่างไรให้หาหรือ ผส.บก.

มติที่ประชุม

รับทราบ

..... กนกพร มีชัยตระกูลผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวกนกพร มีชัยตระกูล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวอาณาสุมินต์ ศิริเขต)
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยผู้อำนวยการและประสานราชการ
