

ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๔ เรื่อง
๑. การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๓. การทำงานของผู้บริหารใหม่
๔. สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท
และคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบท
จำนวน ๒ เรื่อง
๓.๑ ติดตามผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓.๒ ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินส่วนกลางค่างานก่อสร้างและค่าที่ปรึกษา
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๓ เรื่อง
๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการวิเคราะห้และคัดเลือกโครงข่ายสายรองที่สำคัญ
๔.๒ แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖
๔.๓ สรุปรางวัลที่กรมทางหลวงชนบทได้รับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๒ เรื่อง
๕.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินงานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
๕.๒ การสัมมนากรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระการประชุม

ผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท

(หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ประชุมผ่านระบบ VDO Conference และ ระบบ ZOOM Meeting)

ผู้มาประชุม

๑. นายอภิรัฐ	ไชยวงค์น้อย	อทช.	ประธาน
๒. นายผดุงศักดิ์	สรุจิกำจรวัฒนะ	รทช.ด/รท.ผส.ว.	
๓. นายสมชาย	ลีลาประภาภรณ์	รทช.บว./รท.ผอ.ศทส.	
๔. นายอภิชัย	ธีระรังสิกุล	วศญ.ส./รท.ผส.อร.	
๕. นายวีระเดช	ชีวาพัฒนานวนวงศ์	วศญ.บ.	
๖. นายเชษฐา	วินสน	ผส.บก. /รท. ผอ.กผง.	
๗. นายยงยุทธ	เพ็งเมือง	ผส.กท.	
๘. นายอภิชัย	วชิระปการพงษ์	ผส.กส.	
๙. นายสิทธิชัย	ศิริพันธุ์	ผส.คก./รท.ผส.อป.	
๑๐. นายพิชิต	หุ่ศิริ	ผส.บร./รท.ผส.ทช.ที่ ๑๓	
๑๑. นายณรงค์	คูบารมี	ผส.สท.	
๑๒. นายจิระพงษ์	ปิณฑะบุตร	ผส.สอ.	
๑๓. นางสาวฉัตรนภา	รักษาทิเจริญ	ผส.กม.	
๑๔. นายเกษม	สัจจรักษ์	ผส.ทช.ที่ ๑	
๑๕. นายวิทย์	วรวงศ์	ผส.ทช.ที่ ๒	
๑๖. นายสำราญ	สวัสดิ์พูน	ผส.ทช.ที่ ๓	
๑๗. นายอนุพงศ์	จงหวัง	ผส.ทช.ที่ ๔	
๑๘. นายก่อพิภพ	อารยรังศรี	ผส.ทช.ที่ ๕	
๑๙. นายประจักษ์	รัตนมณี	ผส.ทช.ที่ ๖	
๒๐. นายจิรนนท์	ประกอบไวยทยกิจ	ผส.ทช.ที่ ๗	
๒๑. นายชูชัย	พนัสอัมพร	ผส.ทช.ที่ ๘	
๒๒. นายอดิเทพ	ติระมาศวณิช	ผส.ทช.ที่ ๙	
๒๓. นายอภิรัตน์	จิรัชยภิตติ	ผส.ทช.ที่ ๑๐	
๒๔. นายพิสุทธิ	สุทธิพูน	รท.ผส.ทช.ที่ ๑๑	
๒๕. นายชัยยุทธ	เชียวจันทร์	รท.ผส.ทช.ที่ ๑๒	
๒๖. นายดำรงศักดิ์	คงช่วย	ผส.ทช.ที่ ๑๔	
๒๗. นายอนุชิต	ดิชัยทน	ผส.ทช.ที่ ๑๕	
๒๘. นายเรืองเดช	ประวัตรโรตม	ผส.ทช.ที่ ๑๖	
๒๙. นายธงไชย	ชมณอม	ผส.ทช.ที่ ๑๗	
๓๐. นายณัฐวุฒิ	ธีระเสถียรโสภณ	ผส.ทช.ที่ ๑๘	

๓๑. นายชนะชัย	หล่ออภิบาลกุล	ผชช.กผง.
๓๒. นายอาคม	ตันติพงศ์อำภา	ผชช.สสท.
๓๓. นายลิขิต	ทิวธีธรรมเจริญ	ผชช.สกกส.
๓๔. นายสนิท	รัตนศฤงค์	ผชช.สว.
๓๕. นายสมเกียรติ	ชัยประเสริฐ	ผชช.สกกท.
๓๖. นายเขตโสภณ	โกภารัตนานันท์	ผชช.สกกท. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กบค.
๓๗. นางสาววิมล	ตั้งธนศฤคาร	ผอ.สตน.
๓๘. นายชยทัต	วัฒนกุล	แทน ผอ.สพร.
๓๙. นายเดโช	ชนะสุวรรณ	ผอ.กบท.
๔๐. นายโกศล	จันมนทา	ลกน.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธันว์	สินธวาลัย	ผชช.สทช.ที่ ๖ (ขอนแก่น)
๒. นางสาววิภา	ธัญญเจริญ	ผอ.กปผ.สลก.
๓. นางสาวจำลอง	รียนยาน	ผอ.กกง.กบค.
๔. นางกนกกร	ศิริภาพันธุ์	ผอ.กจส.กบค.
๕. นายบุญจอม	พรหมทอง	ผอ.กตป.กผง.
๖. นางสาวหทัยรัตน์	มณีเทศ	ผอ.กวผ.สกกท.
๗. นายจิรานุวัฒน์	จันทรจักร	ผอ.กอท.สสอ.
๘. นายปรีชา	โสภารัตน์	ผอ.กรป.กผง.
๙. นายนพกุล	เสียงบุญ	ผอ.กยบ.สปร.
๑๐. นายพรหมชาติ	เชื้อทอง	ผอ.กผง.สอป.
๑๑. นายสุชีพ	ตันติวุฒิพงศ์	ผอ.กผค.ศทส.
๑๒. นายกวิน	สายประเสริฐกิจ	สนง.อทช.
๑๓. นายจุติพงศ์	พาราพันธกุล	สนง.อทช.
๑๔. นายกฤษฎา	วิเชียรบุตร	สนง.รทช.บว.
๑๕. นายฐานันดร	สวัสดิ์	กผง.
๑๖. นางสาวทุนจิต	ลีละเศรษฐกุล	กบค.
๑๗. นายจิรายุทธ์	ตั้งไพศาลกิจ	สลก.
๑๘. นางสาวดวงขวัญ	รักธรรม	สลก.
๑๙. นางสาวรัชณี	ไร่ดี	สลก.
๒๐. นางสาววิสุตา	อมรพงศ์	สลก.
๒๑. นายนนทพัทธ์	เมืองช้าง	สลก.
๒๒. นายนิตี	หาญรักษ์	ศทส.

เริ่มการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ ๑

เวลา ๑๕.๐๐ น.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๔ เรื่อง

การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และโครงการใดที่มีประเด็นปัญหาขอให้หน่วยดำเนินการแจ้งให้ทราบโดยเร็ว เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒
อทช.

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ปัจจุบันทุกหน่วยงานได้จัดส่งคำขอของบประมาณปี ๒๕๖๗ ส่งมายัง กผง. ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาทบทวนรายการว่าโครงการใดที่ยังตกหล่นหรือมีโครงการใดที่จะเพิ่มเติม และให้พิจารณาความพร้อมในการดำเนินการด้วย โดยขอให้ประสานแจ้งมายัง รทช.ด (นายผดุงศักดิ์ฯ) และ กผง. เพื่อพิจารณาตรวจสอบ เพราะยังเหลือระยะเวลาในการสรุปข้อมูลคำขอของบประมาณปี ๒๕๖๗ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๓
อทช.

การทำงานของผู้บริหารใหม่

การทำงานของผู้บริหารใหม่ ตอนนี้หลายหน่วยงานเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งของหน่วยงานใหม่ จึงขอให้ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่และบุคลากรของหน่วยงานใหม่นั้น ๆ โดยเน้นการทำงานเป็นทีม หากมีประเด็นปัญหาขอให้ประชุมหารือเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความขัดแย้งภายในหน่วยงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๔
อทช.

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ค่อนข้างรุนแรง จึงขอให้ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการแขวงในพื้นที่ภาคใต้ลงพื้นที่และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และดำเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันอุทกภัยที่กรมฯ กำหนด พร้อมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ลกท.

กรมทางหลวงชนบท ได้ประชุมผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ และจัดส่งให้ผู้บริหารทุกท่านทราบ และพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

ในการนี้ ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบท จำนวน ๒ เรื่อง
๓.๑ ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผส.บก/

รก.ผอ.กผง.

กองแผนงาน ขอรายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการ
ดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับรายละเอียดขอให้
นายบุญจอม พรหมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน เป็นผู้รายงาน

นายบุญจอมฯ

ผอ.กตป.กผง.

กผง. ขอรายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖ ดังนี้

★ ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)

งบประมาณทั้งสิ้น	๔๗,๑๐๘.๙๑๔๖ ล้านบาท
เบิกจ่าย	๑,๖๙๖.๗๕๓๒ ล้านบาท (๓.๖๐ %)
๑. งบประจำ	๑,๕๒๕.๖๖๔๔ ล้านบาท (๓.๒๔ %)
เบิกจ่าย	๓๖๖.๒๗๐๑ ล้านบาท (๒๔.๐๑ %)
๑.๑ งบบุคลากร	๑,๔๑๑.๔๑๗๗ ล้านบาท (๙๒.๕๑ %)
เบิกจ่าย	๓๔๔.๖๒๕๗ ล้านบาท (๒๔.๔๒ %)
๑.๒ งบดำเนินงาน	๑๑๓.๖๕๐๑ ล้านบาท (๗.๔๕ %)
เบิกจ่าย	๒๑.๖๔๔๔ ล้านบาท (๑๙.๐๔ %)
๑.๓ งบอุดหนุน	๐.๕๙๖๖ ล้านบาท (๐.๐๔ %)
เบิกจ่าย	- ล้านบาท (- %)
๒. งบลงทุน	๔๕,๕๘๓.๒๕๐๒ ล้านบาท (๙๖.๓๖ %)
เบิกจ่าย	๑,๓๓๐.๔๘๓๑ ล้านบาท (๒.๙๒ %)
๒.๑ ผูกพันเดิม	๖,๓๒๐.๑๘๗๐ ล้านบาท (๑๓.๘๗ %)
เบิกจ่าย	๖๐๔.๗๐๗๒ ล้านบาท (๙.๕๗ %)
๒.๒ รายการใหม่	๓๙,๒๖๓.๐๖๓๒ ล้านบาท (๘๖.๑๓ %)
เบิกจ่าย	๗๒๕.๗๗๕๙ ล้านบาท (๑.๘๕ %)
๒.๒.๑ ค่าที่ดิน และค่าอุปกรณ์	๑,๓๔๕.๕๐๐๐ ล้านบาท (๓.๔๓ %)
เบิกจ่าย	๓๓๓.๙๒๑๙ ล้านบาท (๒๔.๘๒ %)
๒.๒.๒ งานดำเนินการเอง	๔,๒๐๔.๔๙๓๐ ล้านบาท (๑๐.๗๑ %)
เบิกจ่าย	๓๒๕.๑๑๖๖ ล้านบาท (๗.๗๓ %)
๒.๒.๒.๑ ค่าสำรวจออกแบบ	๓๒.๐๘๒๒ ล้านบาท (๐.๗๖ %)
เบิกจ่าย	๐.๘๗๖๑ ล้านบาท (๒.๗๓ %)
๒.๒.๒.๒ ค่าควบคุมงาน	๒๖๕.๑๔๑๒ ล้านบาท (๖.๓๑ %)
เบิกจ่าย	๓๗.๑๙๖๕ ล้านบาท (๑๔.๐๓ %)
๒.๒.๒.๓ งบบำรุงปกติ	๓,๓๘๐.๕๓๗๐ ล้านบาท (๘๐.๔๐ %)
เบิกจ่าย	๒๗๒.๔๑๑๔ ล้านบาท (๘.๐๖ %)
๒.๒.๒.๔ ซ่อมแซม	๑๐๐ ล้านบาท (๒.๓๘ %)
เบิกจ่าย	๓.๖๙๙๑ ล้านบาท (๓.๗๐ %)
๒.๒.๒.๕ อำนวยปกติ	๒๕๗.๔๖๙๑ ล้านบาท (๖.๑๒ %)
เบิกจ่าย	๑๐.๘๙๔๘ ล้านบาท (๔.๒๓ %)
๒.๒.๒.๖ อำนวยฯ ช่วงเทศกาล	๙๔.๑๙๗๒ ล้านบาท (๒.๒๔ %)
เบิกจ่าย	๐.๐๓๘๗ ล้านบาท (๐.๐๔ %)

นายบุญจوما
ผอ.กตป.กผง.

๒.๒.๒.๗ อำนายความปลอดภัยฉุกเฉิน(ส่วนกลาง) ๗๕.๐๐๐๐ ล้านบาท (๑.๗๘ %)
เบิกจ่าย - ล้านบาท (- %)
๒.๒.๒.๘ ปลุกป่าทดแทน ๐.๐๖๖๓ ล้านบาท (๐.๐๐๒ %)
เบิกจ่าย - ล้านบาท (- %)

★ แผนเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)

เดือน		ค.ย.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ย.๖๕	ม.ย.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ย.๖๖	เม.ย.๖๖	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๖
เป้าหมายรัฐบาล (ปี ๖๖)	%			๓๐			๕๑			๗๒			๙๓
ผลเบิกจ่าย ๖๕	ร.ย.	๕๓๖,๕๔๖	๑,๒๐๗,๕๔๓	๒,๑๒๗,๕๔๓	๔,๑๒๗,๕๔๓	๕,๑๒๗,๕๔๓	๖,๑๒๗,๕๔๓	๗,๑๒๗,๕๔๓	๘,๑๒๗,๕๔๓	๙,๑๒๗,๕๔๓	๑๐,๑๒๗,๕๔๓	๑๑,๑๒๗,๕๔๓	๑๒,๑๒๗,๕๔๓
	%	๑.๑๗	๒.๖๔	๔.๖๔	๙.๐๐	๑๑.๐๒	๑๖.๐๒	๒๑.๐๒	๒๖.๐๒	๓๑.๐๒	๓๖.๐๒	๔๑.๐๒	๔๖.๐๒
แผนเบิกจ่าย ๖๖ (ส่ง สง.)	ร.ย.	๕๓๖,๕๔๖	๑,๒๐๗,๕๔๓	๒,๑๒๗,๕๔๓	๔,๑๒๗,๕๔๓	๕,๑๒๗,๕๔๓	๖,๑๒๗,๕๔๓	๗,๑๒๗,๕๔๓	๘,๑๒๗,๕๔๓	๙,๑๒๗,๕๔๓	๑๐,๑๒๗,๕๔๓	๑๑,๑๒๗,๕๔๓	๑๒,๑๒๗,๕๔๓
	%	๑.๑๗	๒.๖๔	๔.๖๔	๙.๐๐	๑๑.๐๒	๑๖.๐๒	๒๑.๐๒	๒๖.๐๒	๓๑.๐๒	๓๖.๐๒	๔๑.๐๒	๔๖.๐๒
แผนเบิกจ่าย ๖๖ (ส่ง คค.)	ร.ย.	๓๐๗,๕๔๓	๑,๐๒๗,๕๔๓	๒,๑๒๗,๕๔๓	๔,๑๒๗,๕๔๓	๕,๑๒๗,๕๔๓	๖,๑๒๗,๕๔๓	๗,๑๒๗,๕๔๓	๘,๑๒๗,๕๔๓	๙,๑๒๗,๕๔๓	๑๐,๑๒๗,๕๔๓	๑๑,๑๒๗,๕๔๓	๑๒,๑๒๗,๕๔๓
	%	๐.๖๕	๒.๖๔	๔.๖๔	๙.๐๐	๑๑.๐๒	๑๖.๐๒	๒๑.๐๒	๒๖.๐๒	๓๑.๐๒	๓๖.๐๒	๔๑.๐๒	๔๖.๐๒
ผลเบิกจ่าย ๖๖	ร.ย.	๑๑๖,๕๔๓	๑,๐๒๗,๕๔๓	๑,๐๒๗,๕๔๓									
	%	๐.๒๕	๒.๖๔	๔.๖๔									

อทช.

ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖ โดยขอให้ รทช.ค. (นายผดุงศักดิ์) เร่งรัด และติดตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖ ของทุกหน่วยงานให้สามารถดำเนินการได้ตามที่ได้กำหนดไว้

นายบุญจوما
ผอ.กตป.กผง.

★ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เรียงภาพรวมสำนักฯ จากน้อยไปมาก)

ส่วนภูมิภาค

หน่วย : ลบ.

ลำดับที่	หน่วยดำเนินการ	งปม.ทั้งสิ้น	PO	เบิกจ่าย ณ ๑๖ ธ.ค.๖๕	ร้อยละ	คงเหลือ
๑	สทช.๑๕ และขทช.	๑,๒๘๓,๗๖๗	๘๙๖,๙๖๗	๑๔,๗๔๖	๑.๑๕	๓๗๖,๐๑๗
๒	สทช.๕ และขทช.	๓,๖๒๕,๗๖๙	๒,๔๑๕,๙๘๕	๔๓,๒๔๓	๑.๑๙	๑,๒๐๙,๕๘๔
๓	สทช.๓ และขทช.	๑,๑๓๘,๓๘๑	๕๗๓,๐๒๘	๑๘,๑๓๖	๑.๕๙	๕๕๗,๒๔๖
๔	สทช.๔ และขทช.	๗๙๓,๕๙๖	๒๓๖,๖๙๑	๑๓,๙๒๖	๑.๗๕	๕๕๖,๖๗๐
๕	สทช.๖ และขทช.	๑,๖๑๖,๗๕๔	๑,๓๒๙,๙๘๕	๓๖,๖๖๐	๒.๐๒	๒๕๐,๑๓๖
๖	สทช.๒ และขทช.	๗๖๓,๖๗๑	๔๐๕,๓๖๙	๑๖,๔๓๘	๒.๑๕	๓๔๗,๒๔๑
๗	สทช.๑๓ และขทช.	๙๐๘,๑๗๒	๕๖๘,๓๓๙	๑๙,๗๐๖	๒.๑๗	๓๘๘,๔๖๖
๘	สทช.๑๐ และขทช.	๙๗๗,๔๔๓	๓๕๔,๙๕๙	๒๑,๖๘๙	๒.๒๒	๖๐๐,๗๙๓
๙	สทช.๑๗ และขทช.	๘๓๔,๓๙๑	๔๖๖,๓๔๖	๒๐,๖๐๗	๒.๔๗	๓๖๗,๗๘๖
๑๐	สทช.๙ และขทช.	๑,๑๐๕,๒๑๙	๗๕๐,๔๓๗	๒๗,๕๔๙	๒.๔๙	๓๒๗,๖๖๗
๑๑	สทช.๑๔ และขทช.	๕๕๙,๖๕๕	๑๘๖,๕๓๗	๑๔,๒๗๖	๒.๕๕	๓๔๕,๓๗๙
๑๒	สทช.๗ และขทช.	๑,๓๐๔,๔๐๗	๕๖๒,๗๕๖	๓๓,๗๖๖	๒.๕๙	๗๗๑,๖๔๑
๑๓	สทช.๑ และขทช.	๓๓๕,๒๕๔	๑๙๕,๘๔๑	๑๐,๖๕๕	๓.๑๘	๑๒๔,๖๐๐
๑๔	สทช.๑๖ และขทช.	๑,๓๙๑,๕๓๐	๙๒๙,๙๕๗	๔๔,๔๘๕	๓.๒๐	๔๐๗,๐๘๖
๑๕	สทช.๑๘ และขทช.	๖๐๐,๑๗๐	๓๒๖,๔๑๐	๑๙,๖๘๖	๓.๒๘	๒๘๐,๔๘๔
๑๖	สทช.๑๒ และขทช.	๑,๘๔๖,๘๖๓	๑,๕๐๐,๓๕๐	๘๘,๓๖๓	๔.๗๘	๖๖๘,๕๐๓
๑๗	สทช.๘ และขทช.	๕๙๒,๒๖๖	๓๓๔,๐๒๗	๓๑,๙๔๗	๕.๓๙	๒๖๐,๓๑๙
๑๘	สทช.๑๑ และขทช.	๔๙๑,๕๕๓	๑๖๕,๑๖๙	๖๖,๕๕๐	๑๓.๕๔	๓๒๕,๘๙๓
	รวมส่วนภูมิภาค	๒๐,๑๖๘,๗๖๖	๑๑,๘๖๙,๑๐๗	๕๓๘,๓๖๖	๒.๖๗	๗,๘๐๑,๒๖๗

นายบุญจوما
ผอ.กตป.กผง.

★ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
ส่วนกลาง หน่วย : ลบ.

หน่วยดำเนินการ	งปม.ทั้งสิ้น	PO	เบิกจ่าย ณ ๑๖ ธ.ค.๖๕	ร้อยละ	คงเหลือ
สภท.	๔,๒๓๔.๙๗๔๓	๑,๑๗๙.๘๘๒๒	๑๙๖.๒๕๘๔	๔.๖๓	๒,๘๕๘.๘๓๓๗
สภส.	๒,๔๔๗.๔๙๓๙	๑,๖๐๑.๐๕๒๙	๒๓๓.๕๐๙๒	๙.๕๔	๖๑๖.๙๓๔๘
สปร.	๒๐๘.๔๙๒๙	๙.๒๙๗๐	๑๓.๓๑๒๗	๖.๓๙	๑๘๕.๘๘๓๒
สอป.	๑๖.๗๙๙๘	-	๐.๒๒๘๗	๑.๓๖	๑๖.๕๗๑๑
สสอ.	๒๗๒.๘๑๖๑	๐.๖๗๕๒	๒๐.๗๓๔๒	๗.๖๐	๒๕๒.๐๘๑๙
สว.	๕๐.๔๒๑๕	๐.๒๔๗๒	๑.๑๙๒๖	๒.๓๗	๔๙.๒๒๘๙
กผง.	๑๐.๙๓๘๐	๐.๔๔๗๐	๐.๓๔๙๑	๓.๑๙	๑๐.๕๘๘๙
สคก.	๒๐๖.๘๖๕๙	๐.๓๙๐๓	๐.๔๓๙๔	๐.๒๑	๒๐๖.๔๒๖๕
สกก.	๑.๑๒๕๐	-	๐.๙๓๒๔	๘๒.๘๘	๐.๑๙๒๖
สคณ.	๐.๑๐๐๐	๐.๐๑๗๕	๐.๐๐๓๐	๓.๐๐	๐.๐๘๒๕
สอ.	๓.๖๗๗๗	๐.๐๓๔๒	๑.๐๓๖๖	๒๘.๑๙	๒.๖๔๑๑
ศทส.	๒๒.๐๘๕๘	-	๐.๔๖๔๗	๒.๑๐	๒๑.๖๒๑๑
สสท.	๑.๗๗๖๙	๐.๐๖๕๔	๐.๔๖๖๔	๒๕.๑๒	๑.๓๑๐๕
สพร.	๐.๒๓๙๐	๐.๐๒๐๒	๐.๐๖๐๘	๒๕.๔๖	๐.๑๗๘๒
สบก.	๔.๐๔๗๗	๐.๐๖๙๐	๐.๓๗๔๒	๙.๒๔	๓.๖๗๓๕
สกก.	๗.๓๕๙๔	๐.๐๘๓๐	๑.๗๑๙๗	๒๓.๓๗	๕.๖๔๐๗
กบพ.	๓.๔๐๑๒	๐.๐๒๕๘	๐.๗๙๓๔	๒๓.๓๓	๒.๖๐๗๘
ค่าที่ดิน	๑,๓๔๕.๕๐๐๐	-	๓๓๓.๙๒๑๙	๒๔.๘๒	๑,๐๑๑.๕๗๘๑
เบิกจ่ายในนามกรมฯ	๑๘,๑๐๒.๐๓๖๙	๑.๓๔๔๒	๓๕๒.๕๙๙๗	๑.๙๕	๑๗,๗๔๙.๔๓๗๒
รวมส่วนกลาง	๒๖,๙๔๐.๑๕๒๐	๒,๗๙๓.๖๕๑๑	๑,๑๕๘.๓๗๗๒	๔.๓๐	๒๕,๗๘๑.๗๗๔๘
รวมทั้งสิ้น	๔๗,๑๐๘.๙๑๔๖	๑๔,๖๒๒.๗๕๘๕	๑,๖๙๖.๗๕๓๒	๓.๖๐	๔๕,๔๑๒.๑๖๑๔

★ ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๖ (ภาพรวม)

จำนวน ๓,๑๓๑ รายการ งปม. ทั้งสิ้น ๓๓,๐๒๐.๖๖๑๙ ลบ.

ขึ้นระบบจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๓,๑๒๘ โครงการ งปม. ทั้งสิ้น ๓๒,๖๑๗.๓๖๖๓ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ	คิดเป็น ร้อยละ	วงเงิน (ลบ.)	คิดเป็นร้อยละ
- ยังไม่รายงานสถานภาพ	๑	๐.๐๓	๐.๒๕๐๐	๐.๐๐
- สำรองออกแบบ/ประมาณราคา	๕๓	๑.๖๙	๓๘๔.๑๑๒๕	๑.๑๘
- ราคาากลาง	๖๔	๒.๐๕	๑,๒๘๘.๔๘๒๓	๓.๙๕
- ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๓๗	๑.๑๘	๕๘๔.๓๓๔๔	๑.๗๙
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๓๘๖	๑๒.๓๔	๖,๐๒๔.๘๙๖๐	๑๘.๔๗
- ทราบผลจัดซื้อจัดจ้าง	๘๑	๒.๕๙	๑,๓๐๘.๕๘๖๐	๔.๐๑
- ขอความเห็นชอบจาก สกป.	๑๔	๐.๔๕	๔๐๓.๐๓๘๔	๑.๒๔
- รอลงนาม	๘๓๑	๒๖.๕๗	๘,๔๖๗.๔๔๒๕	๒๕.๙๖
- ลงนามในสัญญา	๑,๖๖๑	๕๓.๑๐	๑๔,๑๕๖.๒๒๔๒	๔๓.๔๐

นายบุญจอมฯ
ผอ.กตป.กผง.

★ ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๖ (ผูกพัน)

จำนวน ๔๘ รายการ งบประมาณ. ทั้งสิ้น ๑,๓๙๓.๓๑๔๖ ลบ.

ขึ้นระบบจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๔๕ โครงการ งบประมาณ. ทั้งสิ้น ๙๙๖.๘๖๒๖ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ	คิดเป็น ร้อยละ	วงเงิน (ลบ.)	คิดเป็นร้อยละ
- ราคาากลาง	๓	๖.๖๗	๕๙.๕๕๐๐	๕.๙๗
- ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔.๔๔	๔๓.๙๑๕๔	๔.๔๑
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑๓	๒๘.๘๙	๓๙๓.๘๓๗๔	๓๙.๕๑
- ทราบผลจัดซื้อจัดจ้าง	๘	๑๗.๗๘	๗๐.๖๘๖๐	๗.๐๙
- ขอความเห็นชอบจาก สป.	๑๔	๓๑.๑๑	๔๐๓.๐๓๘๔	๔๐.๔๓
- รอลงนาม	๒	๔.๔๔	๑๓.๑๒๐๐	๑.๓๒
- ลงนามในสัญญา	๓	๖.๖๗	๑๒.๗๑๕๔	๑.๒๘

★ ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๖ (ปีเดียว)

จำนวน ๒,๙๓๒ รายการ งบประมาณ. ทั้งสิ้น ๓๑,๒๓๘.๙๔๗๘ ลบ.

ขึ้นระบบจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๒,๙๓๒ โครงการ งบประมาณ. ทั้งสิ้น ๓๑,๒๓๘.๙๔๗๘ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ	คิดเป็น ร้อยละ	วงเงิน (ลบ.)	คิดเป็นร้อยละ
- สํารวจออกแบบ/ประมาณราคา	๔๑	๑.๔๐	๓๖๕.๘๖๘๕	๑.๑๗
- ราคาากลาง	๕๐	๑.๗๑	๑,๒๐๕.๐๖๙๙	๓.๘๖
- ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๓๕	๑.๑๙	๕๔๐.๔๑๙๐	๑.๗๓
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๓๕๘	๑๒.๒๑	๕,๕๐๑.๓๖๑๖	๑๗.๖๑
- ทราบผลจัดซื้อจัดจ้าง	๖๘	๒.๓๒	๑,๒๑๑.๓๐๔๐	๓.๘๘
- รอลงนาม	๗๘๒	๒๖.๖๗	๘,๓๐๕.๐๕๘๐	๒๖.๕๙
- ลงนามในสัญญา	๑,๕๙๘	๕๔.๕๐	๑๔,๑๐๙.๘๖๖๘	๔๕.๑๗

★ ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๖ (ครุภัณฑ์)

จำนวน ๑๕๑ รายการ งบประมาณ. ทั้งสิ้น ๓๘๑.๕๕๕๙ ลบ.

ขึ้นระบบจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๑๕๑ โครงการ งบประมาณ. ทั้งสิ้น ๓๘๑.๕๕๕๙ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ	คิดเป็น ร้อยละ	วงเงิน (ลบ.)	คิดเป็นร้อยละ
- ยังไม่รายงานสถานภาพ	๑	๐.๖๖	๐.๒๕๐๐	๐.๐๗
- สํารวจออกแบบ/ประมาณราคา	๑๒	๗.๙๕	๑๘.๒๔๔๐	๔.๗๘
- ราคาากลาง	๑๑	๗.๒๘	๒๓.๘๖๒๔	๖.๒๕
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕	๙.๙๓	๑๒๙.๖๙๗๐	๓๓.๙๙
- ทราบผลจัดซื้อจัดจ้าง	๕	๓.๓๑	๒๖.๕๙๖๐	๖.๙๗
- รอลงนาม	๔๖	๓๐.๔๖	๑๓๙.๓๖๔๕	๓๖.๕๓
- ลงนามในสัญญา	๖๑	๔๐.๔๐	๔๓.๕๕๒๐	๑๑.๔๑

นายบุญจอมฯ
ผอ.กตป.กผง.

- ★งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๕
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
(จำนวน ๓๑ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๔๗๔.๘๐๖๒ ลบ.)
ลงนามในสัญญา (ครบทุกรายการ)
งบประมาณที่ลงนาม วงเงิน ๔๕๙.๔๒๘๐ ลบ.
- ผลการเบิกจ่าย ๓๐๕.๐๔๖๕ ลบ. (๖๖.๔๐ %)
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๙ รายการ (๖๑.๒๙ %)
- ★งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๕
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
(จำนวน ๓๑ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๔๗๔.๘๐๖๒ ลบ.)

เดือน		มี.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖
แผนเบิกจ่าย ๖๕	ลบ.	๒.๗๔๙๙	๑๑.๔๓๘๔	๓๔.๕๕๘๒	๒๐๙.๗๐๘๔	๒๑๖.๖๒๕๓	๒๙๔.๔๑๕๘	๓๖๒.๑๒๗๘	๔๓๑.๐๖๗๗	๔๔๓.๕๖๕๗	๔๕๙.๔๒๘๐
	%	๐.๖๐	๒.๔๙	๗.๕๒	๔๕.๖๕	๔๗.๑๕	๖๔.๐๘	๗๘.๘๒	๙๓.๘๓	๙๖.๕๕	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย ๖๕	ลบ.	๒.๗๕๐๐	๑๑.๔๓๘๔	๓๔.๕๕๘๒	๒๐๙.๗๐๘๔	๒๑๖.๖๒๕๓	๒๙๐.๙๐๕๑	๓๐๕.๐๔๖๕			
	%	๐.๖๐	๒.๔๙	๗.๕๒	๔๕.๖๕	๔๗.๑๕	๖๓.๓๒	๖๖.๔๐			

- ★งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๕
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ
ครั้งที่ ๒
(จำนวน ๒๕ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๕๐๒.๙๑๐๐ ลบ.)
ลงนามในสัญญา (ครบทุกรายการ)
งบประมาณที่ลงนาม วงเงิน ๔๘๙.๔๔๐๐ ลบ.
- ผลการเบิกจ่าย ๑๐๑.๘๘๓๘ ลบ. (๒๐.๘๒ %)
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๔ รายการ (๑๖.๐๐ %)
- ★งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๕
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ
ครั้งที่ ๒
(จำนวน ๒๕ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๕๐๒.๙๑๐๐ ลบ.)

เดือน		ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕	ม.ค.๖๖	ก.พ.๖๖	มี.ค.๖๖	เม.ย.๖๖	พ.ค.๖๖	มี.ย.๖๖
แผนเบิกจ่าย ๖๕	ลบ.	๖.๐๐๙๗	๑๑.๙๔๙๖	๔๓.๐๖๗๔	๙๐.๔๐๐๒	๑๔๕.๕๘๑๙	๒๓๙.๑๙๗๖	๓๕๑.๒๗๔๐	๔๒๕.๖๙๔๖	๔๘๙.๔๔๐๐	๔๘๙.๔๔๐๐
	%	๑.๒๓	๒.๔๔	๘.๘๐	๑๘.๔๗	๒๙.๙๔	๔๘.๘๗	๗๑.๙๗	๘๖.๙๘	๑๐๐	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย ๖๕	ลบ.	๖.๐๐๙๗	๑๑.๙๔๙๖	๔๓.๐๖๗๔	๑๐๑.๘๘๓๘						
	%	๑.๒๓	๒.๔๔	๘.๘๐	๒๐.๘๒						

นายบุญจอนฯ
ผอ.กตป.กผง.

★สรุปการรายงานสถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามหน่วย
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานดำเนินการ	รายการ	รายการที่ส่ง คค. ครั้งที่ 1-6	(A) รวมที่โอนแล้ว	สถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง								(C) คงเหลือที่ยัง ไม่ลงนาม (A) - (B)
				1 = ดำรง ออกแบบ/ ประมาณราคา	2 = ราคาตกลง	3 = ร่าง ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	4 = ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	5 = ทรานสแล นจัดซื้อจัดจ้าง	6 = ขอความ เห็นชอบจาก สอ.ป.	7 = ทราน สแลมจัดซื้อ สั่งจ้าง	(B) 8 = ลงนาม ในสัญญา	
กองแผนงาน	1	0	0	-	-	-	-	1	-	-	0	0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	0	1
สำนักก่อสร้างทาง	13	3	3	-	-	1	6	-	2	4	0	3
สำนักก่อสร้างสะพาน	22	3	3	-	3	-	4	2	10	3	0	3
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร	21	0	0	-	-	-	13	1	-	7	0	0
สำนักบำรุงทาง	136	2	2	-	37	12	64	22	-	1	0	2
สำนักวิศวกรรมวัสดุและพัฒนา	17	1	2	-	-	-	12	-	-	5	0	2
สำนักสำรวจและออกแบบ	17	13	17	-	-	-	1	-	-	1	15	2
สำนักอำนวยความสะดวก	23	3	3	2	-	-	2	15	-	4	0	3
รวมส่วนกลาง	252	26	31	3	40	13	102	42	12	25	15	16
สทพ.ที่ 1 (ปทุมธานี)	142	36	49	6	0	2	44	0	1	59	30	19
สทพ.ที่ 1 (ปทุมธานี)	18	4	4	1	-	-	7	-	-	6	4	0
จทพ.นนทบุรี	29	13	14	-	-	1	8	-	-	6	14	0
จทพ.ปทุมธานี	19	0	1	-	-	-	12	-	-	6	1	0
จทพ.พระนครศรีอยุธยา	46	11	20	4	-	1	8	-	1	24	8	12
จทพ.สมุทรปราการ	13	1	2	1	-	-	5	-	-	5	2	0
จทพ.อ่างทอง	17	7	8	-	-	-	4	-	-	12	1	7
สทพ.ที่ 2 (สระบุรี)	167	66	82	11	2	1	33	0	0	60	60	22
สทพ.ที่ 2 (สระบุรี)	20	11	11	2	-	-	1	-	-	13	4	7
จทพ.ชัยนาท	42	12	13	2	1	-	11	-	-	19	9	4
จทพ.ลพบุรี	37	27	33	-	-	-	4	-	-	2	31	2
จทพ.สระบุรี	25	10	12	5	-	1	7	-	-	4	8	4
จทพ.สิงห์บุรี	43	6	13	2	1	-	10	-	-	22	8	5
สทพ.ที่ 3 (ชลบุรี)	172	102	131	1	3	0	14	2	0	37	115	16
สทพ.ที่ 3 (ชลบุรี)	11	7	8	-	-	-	1	-	-	4	6	2
จทพ.จันทบุรี	49	27	35	-	-	-	6	2	-	9	32	3
จทพ.ชลบุรี	49	27	45	-	1	-	2	-	-	4	42	3
จทพ.ตราด	25	22	23	-	-	-	-	-	-	2	23	0
จทพ.ระยอง	38	19	20	1	2	-	5	-	-	18	12	8

หน่วยงานดำเนินการ	รายการ	รายการที่ส่ง คค. ครั้งที่ 1-6	(A) รวมที่โอนแล้ว	สถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง								(C) คงเหลือที่ยัง ไม่ลงนาม (A) - (B)
				1 = ดำรง ออกแบบ/ ประมาณราคา	2 = ราคาตกลง	3 = ร่าง ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	4 = ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	5 = ทรานสแล นจัดซื้อจัดจ้าง	6 = ขอความ เห็นชอบจาก สอ.ป.	7 = ทราน สแลมจัดซื้อ สั่งจ้าง	(B) 8 = ลงนาม ในสัญญา	
สทพ.ที่ 4 (เพชรบุรี)	140	68	83	1	1	1	19	10	1	53	54	29
สทพ.ที่ 4 (เพชรบุรี)	28	24	24	-	-	-	-	-	1	9	18	6
จทพ.ประจวบคีรีขันธ์	30	24	25	-	-	-	3	-	-	10	17	8
จทพ.เพชรบุรี	21	11	15	-	-	-	2	-	-	7	12	3
จทพ.ราชบุรี	20	0	1	1	1	1	8	1	-	8	0	1
จทพ.สมุทรสงคราม	17	1	2	-	-	-	6	1	-	10	0	2
จทพ.สมุทรสาคร	24	8	16	-	-	-	-	8	-	9	7	9
สทพ.ที่ 5 (นครราชสีมา)	347	213	243	6	1	2	21	17	0	117	183	60
สทพ.ที่ 5 (นครราชสีมา)	59	59	59	-	-	-	-	-	-	7	52	7
จทพ.ชัยภูมิ	70	49	67	-	-	-	1	-	-	27	42	25
จทพ.นครราชสีมา	74	0	10	6	-	2	13	11	-	41	1	9
จทพ.บุรีรัมย์	119	85	86	-	1	-	7	6	-	33	72	14
จทพ.สุรินทร์	25	20	21	-	-	-	-	-	-	9	16	5
สทพ.ที่ 6 (ขอนแก่น)	166	137	149	2	1	0	2	0	0	26	135	14
สทพ.ที่ 6 (ขอนแก่น)	18	15	15	-	-	-	2	-	-	1	15	0
จทพ.ขอนแก่น	49	37	40	-	-	-	-	-	-	10	39	1
จทพ.มหาสารคาม	22	20	21	-	1	-	-	-	-	6	15	6
จทพ.ร้อยเอ็ด	47	39	45	2	-	-	-	-	-	4	41	4
จทพ.เลย	30	26	28	-	-	-	-	-	-	5	25	3
สทพ.ที่ 7 (อุบลราชธานี)	192	149	169	1	1	0	6	0	0	27	156	13
สทพ.ที่ 7 (อุบลราชธานี)	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	11	0
จทพ.อุบลราชธานี	35	31	32	-	-	-	-	-	-	2	32	0
จทพ.ศรีสะเกษ	40	31	32	-	-	-	1	-	-	8	31	1
จทพ.อำนาจเจริญ	68	46	62	-	1	-	-	-	-	11	56	6
จทพ.อุบลราชธานี	38	30	32	1	-	-	5	-	-	6	26	6

นายบุญจوما
ผ.กตป.กผง.

★สรุปการรายงานสถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามหน่วย
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานดำเนินการ	รายการ	รายการที่ส่ง คส. 1-6	(A) รวมที่โอนแล้ว	สถานภาพการจัดจ้าง								(C) ผลสัมฤทธิ์ ไม่รวม (A) - (B)
				1 - สัญญา สถานภาพ/ ประมวลผล	2 - ราคากลาง	3 - ราคากลาง ประมวล จัดซื้อจัดจ้าง	4 - ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	5 - พิจารณา ใบเสนอราคา	6 - ขอความ เห็นชอบจาก สท.ม.	7 - การ อนุมัติซื้อ สิ่งจ้าง	8 - ลงนาม ในสัญญา	
สพ.ที่ 15 (การฟื้นฟู)	149	117	134	1	2	3	5	0	0	26	112	22
สพ.ที่ 16 (กาฬสินธุ์)	17	15	15	-	2	-	-	-	-	2	13	2
สพ.กาฬสินธุ์	29	24	26	-	-	-	-	-	-	15	14	12
รพ.นครพนม	52	40	51	-	-	-	-	-	-	2	50	1
รพ.มุกดาหาร	26	15	18	-	-	3	5	-	-	7	11	7
รพ.สกลนคร	25	23	24	1	-	-	-	-	-	-	24	0
สพ.ที่ 17 (บึงกาฬ)	125	83	89	1	6	1	13	0	0	29	75	14
สพ.ที่ 17 (บึงกาฬ)	14	9	9	-	-	1	3	-	-	2	8	1
รพ.เมืองยาง	33	16	17	-	6	-	4	-	-	12	11	6
รพ.น่าน	28	25	26	1	-	-	-	-	-	2	25	1
รพ.น่าน	20	8	9	-	-	-	4	-	-	12	4	5
รพ.น่าน	30	25	28	-	-	-	2	-	-	1	27	1
สพ.ที่ 18 (สุพรรณบุรี)	94	58	70	1	0	0	5	0	0	38	49	21
สพ.ที่ 18 (สุพรรณบุรี)	14	14	14	-	-	-	-	-	-	2	12	2
รพ.กาญจนบุรี	27	14	15	-	-	-	3	-	-	11	13	2
รพ.นครราชสีมา	24	13	22	-	-	-	1	-	-	11	12	10
รพ.นครราชสีมา	29	17	19	1	-	-	1	-	-	15	12	9
รวมส่วนภูมิภาค	2,376	1,768	2,059	50	24	24	284	39	2	805	1,647	392
รวมทั้งสิ้น	3,128	1,794	2,070	53	64	37	386	81	14	830	1,662	406

รทช.ด.

ภาพรวมที่ กผง. ได้นำเสนอมาข้างต้น จะขอพิจารณาเริ่มที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และต้อง
มีเป้าหมายที่ต้องวัดผลที่ชัดเจน เมื่อพิจารณาในภาพรวมของสถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่ง
ที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญ คือ ยอดที่ได้มีการโอนเงินจากส่วนกลางไปที่หน่วยดำเนินการแล้ว
แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ประมาณ ๔๐๘ รายการ ซึ่งแต่ละหน่วยต้องทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง
มาลงนามในสัญญา ให้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จากยอดดังกล่าวมาดูเป็นราย
หน่วยยังเหลือจำนวนมากที่ได้รับงบประมาณไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จึงต้องเร่งรัด
ให้ทุกหน่วยงานที่เป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้างเร่งรัดดำเนินการในส่วนนี้ให้เร็วที่สุด ซึ่งจะสามารถ
เพิ่มยอดจาก ๑,๖๖๒ รายการ เป็น ๒,๐๐๐ รายการ ได้ และที่จะลงนามในสัญญาไม่ได้ตาม
กำหนดประมาณ ๖๐๐ รายการ แต่ใน ๖๐๐ รายการ ต้องการจะให้ทราบผลให้ได้มากที่สุด
แต่อาจจะไม่สามารถทราบผลได้ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพราะยังมีสถานะที่ ๑ - ๓
เหลืออยู่ ยังดำเนินการไม่ได้ หากในช่วงสิ้นปี ๒๕๖๕ ยังไม่ทราบผล จะทำให้การลงนามใน
สัญญาจะล่าช้าออกไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จะล่าช้ากว่าแผนไป ๒ เดือน ทำให้การชี้แจง
ต่อกระทรวงคมนาคมเป็นไปได้ยาก หากสามารถดำเนินการให้อยู่ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖
ได้ทั้งหมด ยังสามารถชี้แจงกับกระทรวงคมนาคมได้ ทุกหน่วยงานต้องติดตามเป็นรายการ
เพื่อให้เป็นไปตามแผนของแต่ละหน่วยที่ตั้งไว้ ส่งผลทำให้แผนในภาพรวมของกรมฯ มีความ
ถูกต้องและชัดเจนขึ้น

อทช.

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน
๔๐๘ รายการ ภายในสัปดาห์นี้ต้องทราบผลแล้วว่าหน่วยใดยังไม่ลงนามในสัญญาบ้าง ขอให้
ทุกหน่วยงานเร่งรัดประสานผู้รับจ้างเพื่อมาลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการ หากหน่วยใด
ยังไม่ดำเนินการ ขอให้ กผง. รายงานให้ทราบด้วย ปัจจุบันการทำงานจะต้องทำงานแข่งกับเวลา
ทำงานเชิงรุก สิ่งใดที่มีความพร้อมให้ดำเนินการทันที ซึ่ง ศทส. ได้จัดทำระบบเพื่อให้ติดตามได้
ตลอดเวลา และขอให้ รทช.บว. ติดตามหน่วยงานในส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิดด้วย หน่วยงานใด
ที่ดำเนินการไม่ได้ต้องมีเหตุผลสามารถชี้แจงได้ และในสถานะที่ ๑ - ๓ ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ต้องไปดูว่าปัญหาเกิดจากปัญหาอะไร และแก้ไขโดยเร็ว เพื่อให้งานสามารถดำเนินการต่อไปได้

รทช.ด.

สำหรับแผนเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖ ยังได้ต่ำกว่าแผน แต่เป็นแผนในภาพรวม ซึ่งต้อง
ร่วมมือร่วมใจกันเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % เพื่อให้เป็นไปตามแผน

นายบุญจอมฯ

ผอ.กตป.กผง.

✦ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยยึดงบประมาณที่รับตามระบบ GFMS
(ผลเบิกจ่าย adv. ๑๕ % รายการผูกพันใหม่)

หน่วยดำเนินการ	รายการผูกพันใหม่			เบิกจ่ายแล้ว ณ 14 ส.ค. 65			คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 15%		หมายเหตุ
	จำนวน (รายการ)	วงเงินรวม (บาท)	วงเงินรวม 15% (บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงินรวม (บาท)	คิดเป็น (ร้อยละ)	จำนวน (รายการ)	วงเงินรวม (บาท)	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)	1	16,970,000	2,545,500	-	-	-	1	2,545,500	
รวม	1	16,970,000	2,545,500	0	-	-	1	2,545,500	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)	1	26,460,000	3,969,000	0	-	-	1	3,969,000	
รวม	1	26,460,000	3,969,000	0	-	-	1	3,969,000	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)	1	19,500,000	2,925,000	0	-	-	1	2,925,000	
รวม	1	19,500,000	2,925,000	0	-	-	1	2,925,000	
	3	62,930,000	9,439,500	0	-	-	3	9,439,500	

✦ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยยึดงบประมาณที่รับตามระบบ GFMS
(ผลเบิกจ่าย adv. ๑๕ % รายการปีเดียวตั้งแต่ ๑๐.๐๐๐๐ ลบ.)

หน่วยดำเนินการ	รายการผูกพัน 10 ส.ค.			เบิกจ่ายแล้ว ณ 14 ส.ค. 65			คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 15%		หมายเหตุ
	จำนวน (รายการ)	วงเงินรวม (บาท)	วงเงินรวม 15% (บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงินรวม (บาท)	คิดเป็น (ร้อยละ)	จำนวน (รายการ)	วงเงินรวม (บาท)	
ส่วนภูมิภาค									
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)	4	93,840,000	14,076,000	0	-	-	4	14,076,000	
แขวงทางหลวงชนบทหนองเสือ									
แขวงทางหลวงชนบทกำแพงแสน									
แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช									
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ									
แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง									
รวม	4	93,840,000	14,076,000	0	-	-	4	14,076,000	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สมุทรปราการ)	4	100,920,980	15,138,147	0	-	-	4	15,138,147	
แขวงทางหลวงชนบทศรีราชา	3	51,950,000	7,792,500	0	-	-	3	7,792,500	
แขวงทางหลวงชนบทคลองใหญ่	9	136,855,000	20,528,250	0	-	-	9	20,528,250	
แขวงทางหลวงชนบทคลองใหญ่	1	17,085,000	2,622,750	0	-	-	1	2,622,750	
แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี							0	0	
รวม	17	307,210,980	46,081,647	0	-	-	17	46,081,647	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)	5	198,325,000	29,748,750	0	-	-	5	29,748,750	
แขวงทางหลวงชนบทศรีราชา	1	17,690,000	2,653,500	0	-	-	1	2,653,500	
แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	8	133,640,000	20,046,000	1	1,769,250	12.50	7	18,276,750	
แขวงทางหลวงชนบทตราด	4	71,798,000	10,769,700	0	-	-	4	10,769,700	
แขวงทางหลวงชนบทระยอง	2	33,280,000	4,992,000	0	-	-	2	4,992,000	
รวม	20	456,733,000	68,209,950	1	1,769,250	5.00	19	66,440,700	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)	3	113,198,000	16,979,700	0	-	-	3	16,979,700	
แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์	1	14,995,000	2,249,250	0	-	-	1	2,249,250	
แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี	1	13,990,000	2,098,500	0	-	-	1	2,098,500	
แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์									
แขวงทางหลวงชนบททวาย									
แขวงทางหลวงชนบททวาย									
แขวงทางหลวงชนบททวาย									
รวม	5	142,183,000	21,327,450	0	-	-	5	21,327,450	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)	50	1,613,560,500	242,034,075	0	-	-	50	242,034,075	
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ	9	108,732,000	16,309,800	0	-	-	9	16,309,800	
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา									
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์	35	523,297,888	78,494,683	0	-	-	35	78,494,683	
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์	1	9,981,000	1,497,150	0	-	-	1	1,497,150	
รวม	95	2,255,571,388	338,335,708	0	-	-	95	338,335,708	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)	13	545,254,000	81,788,100	0	-	-	13	81,788,100	
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น	12	184,133,350	27,620,003	0	-	-	12	27,620,003	
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม	5	70,350,000	10,552,500	0	-	-	5	10,552,500	
แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด	9	151,255,900	22,688,385	0	-	-	9	22,688,385	
แขวงทางหลวงชนบทพนม	5	61,976,000	9,296,400	1	2,249,250	20.00	4	7,047,150	
รวม	44	1,012,969,250	151,945,388	1	2,249,250	2.27	43	149,696,138	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)	10	352,186,000	52,827,900	0	-	-	10	52,827,900	
แขวงทางหลวงชนบทบึงสามพัน	6	138,028,000	20,704,200	0	-	-	6	20,704,200	
แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ	4	64,226,820	9,634,023	0	-	-	4	9,634,023	
แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ	2	34,509,000	5,176,350	0	-	-	2	5,176,350	
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี	2	30,976,000	4,646,400	0	-	-	2	4,646,400	
รวม	24	619,925,820	92,988,873	0	-	-	24	92,988,873	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครราชสีมา)	4	118,237,000	17,735,550	0	-	-	4	17,735,550	
แขวงทางหลวงชนบทพริ้นท์เพลท	1	19,986,000	2,997,900	0	-	-	1	2,997,900	
แขวงทางหลวงชนบทพริ้นท์เพลท									
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา									
แขวงทางหลวงชนบทพริ้นท์เพลท									
แขวงทางหลวงชนบทพริ้นท์เพลท									
รวม	3	29,950,000	4,492,500	0	-	-	3	4,492,500	
รวม	8	168,173,000	25,225,950	0	-	-	8	25,225,950	

นายบุญจุมมา
ผอ.กตป.กผง.

★ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยยึดงบประมาณที่รับตามระบบ GFMS
(ผลเบิกจ่าย adv. ๑๕ % รายการปีเดียวตั้งแต่ ๑๐.๐๐๐๐ ลบ.)

หน่วยดำเนินการ	รายการเงิน 10 ลบ.			เบิกจ่ายแล้ว ณ 14 ธ.ค. 65			คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 15%		หมายเหตุ
	จำนวน (รายการ)	วงเงินรวม (บาท)	วงเงินรวม 15% (บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงินรวม (บาท)	คิดเป็น (ร้อยละ)	จำนวน (รายการ)	วงเงินรวม (บาท)	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (สุพรรณบุรี)	9	352,328,000	52,849,200	0	-	-	9	52,849,200	
แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก	2	26,992,500	4,048,875	0	-	-	2	4,048,875	
แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์	6	99,903,000	14,985,450	1	1,797,000	16.67	5	13,188,450	
แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	1	9,995,000	1,499,250	1	1,499,250	100.00	0	0	
แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์									
รวม	18	489,218,500	73,382,775	2	3,296,250	11.11	16	70,086,525	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)	4	103,155,900	15,473,385	0	-	-	4	15,473,385	
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	3	39,160,000	5,874,000	0	-	-	3	5,874,000	
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน									
แขวงทางหลวงชนบทลำปาง	3	35,435,000	5,315,250	0	-	-	3	5,315,250	
แขวงทางหลวงชนบทลำพูน									
รวม	10	177,750,900	26,662,635	0	-	-	10	26,662,635	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)									
แขวงทางหลวงชนบทชุมพร	4	52,952,900	7,942,935	0	-	-	4	7,942,935	
แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช									
แขวงทางหลวงชนบทตรัง									
แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี	4	53,065,000	7,959,750	0	-	-	4	7,959,750	
รวม	8	106,017,900	15,902,685	0	-	-	8	15,902,685	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)	11	282,844,000	42,426,600	0	-	-	11	42,426,600	
แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส	10	125,764,000	18,864,600	0	-	-	10	18,864,600	
แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี									
แขวงทางหลวงชนบทยะลา	1	13,495,000	2,024,250	0	-	-	1	2,024,250	
แขวงทางหลวงชนบทยะลา									
แขวงทางหลวงชนบทสตูล	9	164,980,000	24,767,000	4	10,649,250	44.94	5	14,097,750	
รวม	31	587,083,000	88,042,450	4	10,649,250	12.90	27	77,413,200	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)	2	47,975,500	7,196,325	0	-	-	2	7,196,325	
แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา	3	42,930,000	6,439,500	0	-	-	3	6,439,500	
แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	5	63,024,000	9,453,600	0	-	-	5	9,453,600	
แขวงทางหลวงชนบทบึงฉลวย									
แขวงทางหลวงชนบทบึงสามพัน									
แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว	5	74,832,000	11,224,800	0	-	-	5	11,224,800	
รวม	15	228,761,500	34,314,225	0	-	-	15	34,314,225	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)									
แขวงทางหลวงชนบทกระบี่									
แขวงทางหลวงชนบทตรัง									
แขวงทางหลวงชนบทพังงา									
แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต	1	9,999,000	1,499,850	0	-	-	1	1,499,850	
แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต	2	25,982,000	3,897,300	1	2,248,050	50.00	1	1,649,250	
รวม	3	35,981,000	5,397,150	1	2,248,050	33.33	2	3,149,100	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (สุราษฎร์ธานี)	7	236,800,222	35,520,033	0	-	-	7	35,520,033	
แขวงทางหลวงชนบทพังงา	7	130,525,678	19,578,852	0	-	-	7	19,578,852	
แขวงทางหลวงชนบทพังงา	5	73,435,000	11,015,250	0	-	-	5	11,015,250	
แขวงทางหลวงชนบทพุนพิน	5	93,610,000	14,041,500	0	-	-	5	14,041,500	
แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี	4	78,283,000	11,742,450	0	-	-	4	11,742,450	
รวม	28	612,653,900	91,898,085	0	-	-	28	91,898,085	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)	5	162,668,000	24,370,200	0	-	-	5	24,370,200	
แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์									
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น	7	112,191,000	16,828,650	0	-	-	7	16,828,650	
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม									
แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด	8	147,278,000	22,091,700	3	8,839,950	37.50	5	13,251,750	
รวม	20	421,937,000	63,290,550	3	8,839,950	15.00	17	54,450,600	

★ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยยึดงบประมาณที่รับตามระบบ GFMS
(ผลเบิกจ่าย adv. ๑๕ % รายการปีเดียวตั้งแต่ ๑๐.๐๐๐๐ ลบ.)

หน่วยดำเนินการ	รายการเงิน 10 ลบ.			เบิกจ่ายแล้ว ณ 14 ธ.ค. 65			คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 15%		หมายเหตุ
	จำนวน (รายการ)	วงเงินรวม (บาท)	วงเงินรวม 15% (บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงินรวม (บาท)	คิดเป็น (ร้อยละ)	จำนวน (รายการ)	วงเงินรวม (บาท)	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)	8	151,091,000	22,663,650	0	-	-	8	22,663,650	
แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย	4	66,004,000	9,900,600	0	-	-	4	9,900,600	
แขวงทางหลวงชนบทน่าน	4	65,558,000	9,833,700	0	-	-	4	9,833,700	
แขวงทางหลวงชนบทพะเยา									
แขวงทางหลวงชนบทแพร่	3	37,788,000	5,668,200	1	1,834,500	33.33	2	3,833,700	
รวม	19	320,441,000	48,066,150	1	1,834,500	5.26	18	46,231,650	
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)	8	215,809,000	32,371,350	0	-	-	8	32,371,350	
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี									
แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม									
แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี									
รวม	8	215,809,000	32,371,350	0	-	-	8	32,371,350	
รวม	377	8,250,260,138	1,237,539,021	13	30,886,500	3.45	364	1,206,652,521	

- อทช.** ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้ดี ขอความร่วมมือเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % หากมีปัญหาและอุปสรรคใดขอให้แจ้งเข้ามา เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปัญหาทุกหน่วยต้องดำเนินการ และทำงานเป็นทีม
- รทช.ด.** สำหรับงบประมาณสิทธิ์ที่ดิน ดำเนินการได้เกินกว่าแผนไปแล้ว แต่พอในช่วงกลาง ๆ ปี อาจจะล่าช้า เพราะจะมีบางรายการที่ต้องมีการออก พรฎ. ต้องเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งกระบวนการนี้จะล่าช้ามาก ในส่วนงบบำรุงปกติ และงบดำเนินการเอง ก็จะมีงบล่าช้า เพราะจะเห็นว่ามีการเบิกจ่ายแล้ว ต้องไปเร่งรัดเบิกจ่ายค่าวัสดุ , ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องวางแผนเบิกจ่ายในหมวดนี้ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ด้วย จึงจะทำให้ยอดงบดำเนินการเองใกล้เคียงกับแผนมากขึ้น
- อทช.** สำหรับงบดำเนินการเอง ขอให้ สปร. ประสาน ขทช.ทุกแขวงว่าส่วนใดที่สามารถดำเนินการได้ การดำเนินการในทุกมิติ ผส.ทช.ที่ ๑ – ๑๘ และ ผอ.ขทช.ทุกแขวง ต้องวางแผนในทุกรายการ ให้มีความเหมาะสม และทุกเดือนให้มีการอัปเดตแผนว่าดำเนินการได้เป็นไปตามแผนหรือไม่ หรือจะต้องปรับปรุงแก้ไขแผนอย่างไร ต้องจัดทำแผนให้ได้ หน่วยใดทำแผนไม่เป็นให้ไปศึกษาจากหน่วยที่ดำเนินการได้ดีและหาทีมงานเก่ง ๆ เข้ามาช่วยดำเนินการ
- รทช.ด.** สำหรับ งบผูกพันเดิม ส่วนมากอยู่ที่ส่วนภูมิภาค บางรายการอยู่ที่ สกส. สกท. ซึ่งถ้าจะให้ดำเนินการ ต้องไปเร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันออกให้หมด จึงจะมาเบิกเงินปี ๒๕๖๖ งบผูกพันให้ไปดูงบประมาณปี ๒๕๖๕ ที่กันไว้เบิกเหลือปี ต้องเอาเงินปี ๒๕๖๕ ออกให้หมด จึงมาเบิกเงินปี ๒๕๖๖ ทำให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินปี ๒๕๖๖ ได้ ในกรณีผูกพันเดิม และเงินกันเหลือปี ๒๕๖๕ ที่ดำเนินการมา ทางกระทรวงคมนาคมมีการติดตามเป็นวาระเฉพาะ ซึ่งจะเร่งรัดอย่างไร หากไปดูจากข้อมูลบางรายการจะเห็นว่าป็นรายการปีเดียวที่ผลการก่อสร้างมาก แต่ไม่มีการเบิกเงิน ถ้าไปดูเงินงวดที่โอนเข้า ทอยยเบิกออกมาเป็นงวด ๆ ตัวนี้จะช่วยให้ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นได้
- อทช.** ขอให้ สทช.ที่ ๑ – ๑๘ และ ขทช.ทุกแขวง จัดทำแผนของหน่วยงาน และต้องจัดทำแผนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง หากทำแผน และมีการคาดเคลื่อนจากแผนไปมาก จะมีการคาดโทษ เพราะถือว่าไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ขอให้ทุกหน่วยไปทบทวนแผน และส่งแผนให้ กผง. ทั้งนี้ ขอให้ รทช.บว. กำชับและติดตามหน่วยงานส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการจัดทำแผนให้ถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริง และ รทช.ด. เร่งรัดติดตามให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
- รทช.บว.** ขอเพิ่มเติม ได้รับรายงานว่าผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานเพราะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ดังนั้น หน้าที่ของผู้บริหารและกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องดำเนินการตามหนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลางฉบับใหม่ และต้องมีการปรับแผนวงเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา และแผนกับเนื้อหาจะต้องไม่เกินค่าปรับร้อยละ ๐ ตามหนังสือสั่งการดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้ สกท. จะเป็นต้นแบบได้ นอกจากนั้นยังมีเรื่องการยกเลิกสัญญาจ้าง จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ตรวจรับพัสดุตรวจสอบเป็นรายโครงการ เพื่อดำเนินการตามหนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลาง
- อทช.** สำนักฝึกอบรม ปัจจุบันมีการอบรมค่อนข้างมาก รวมทั้งการจัดอบรมสัมมนา จึงขอให้พิจารณาหัวข้อเรื่องและเนื้อหาของการอบรมควรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ และเป็นเรื่องที่จะนำมาใช้ในการทำงาน เช่น เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะ ผอ.ขทช. บางราย ได้รับการแต่งตั้งใหม่อาจจะขาดความรู้และประสบการณ์ โดยเฉพาะ ผอ.ขทช.ที่ไม่เคยทำงานในส่วนภูมิภาคควรต้องได้รับการอบรม

รทช.ด.

ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในแต่ละวงเงิน งบประมาณว่าดำเนินการเบิกจ่ายได้จำนวนกี่ครั้งในแต่ละรายการ ตามตารางนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	แบ่งงวดงานให้เอื้อต่อ การเร่งรัดเบิกจ่าย	เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕%	เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ภายในก.ย.๖๖	การส่งมอบงาน (เบิกจ่าย)
๑	รายการปีเดียว	ตั้งแต่ ๑๐ ลบ.ขึ้นไป	✓	✓	✓	ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง
		ตั้งแต่ ๕ ลบ. ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๐ ลบ.	✓	-	✓	ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง
		ต่ำกว่า ๕ ลบ.	-	-	✓	๑ ครั้ง หรือมากกว่าตามความเหมาะสม
๒	รายการผูกพัน	ผูกพันเดิม ทั้งหมด	-	-	✓	อย่างน้อยไตรมาสละ ๒ ครั้ง
		ผูกพันใหม่ ทั้งหมด	✓	✓	✓	อย่างน้อยไตรมาสละ ๒ ครั้ง

อทช.

ขอให้ สพร. จัดทำแบบประเมิน โดยจัดทำช่องคะแนนการประเมินเป็นรายโครงการ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ข้อสั่งการที่สั่งการมาเป็นข้อสั่งการที่มาจากภาพรวมของกระทรวงคมนาคม ทุกหน่วยต้องดำเนินการ

วศย.ส.

ขอเพิ่มเติม การแบ่งงวดงาน และการส่งงวดงาน ขอให้ส่ง ๒ ครั้ง หรือ ๓ ครั้ง บางครั้งทำเสร็จแล้วเบิกไม่ได้ เพราะแบ่งงวดงานไม่ตรงกับที่ทำจริง จึงขอให้แบ่งงวดงานให้เป็นไปตามการทำงานจริง สามารถแก้สัญญาได้ แต่กระบวนการแก้ไขสัญญาต้องดำเนินการให้รวดเร็ว

อทช.


การแบ่งงวดงาน ขอให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดด้วย ท่าน รทช. และ วศย. ที่เป็นประธานตรวจการจ้าง จะเห็นถึงการแบ่งงวดงานของหน่วยดำเนินการ ขอให้มีการให้คะแนนในเรื่องการแบ่งงวดงาน เพราะการแบ่งงวดงานที่ดีจะส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมฯ ที่ดีด้วย

รทช.บว.

ขอเพิ่มเติมจากการที่ได้ไปตรวจติดตามหน่วยงานในส่วนภูมิภาค มีหลายหน่วยงาน เช่น ขทช.ใหม่ ยังขาดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานหลายด้าน คงจะต้องมีการอบรมให้ความรู้ หรือมีการเรียนรู้เพิ่มเติม

ผส.บก./รท.ผอ.กผง.

ขอรายงานการจัดทำคำของบประมาณปี ๒๕๖๗ ของกรมทางหลวงชนบท ดังนี้

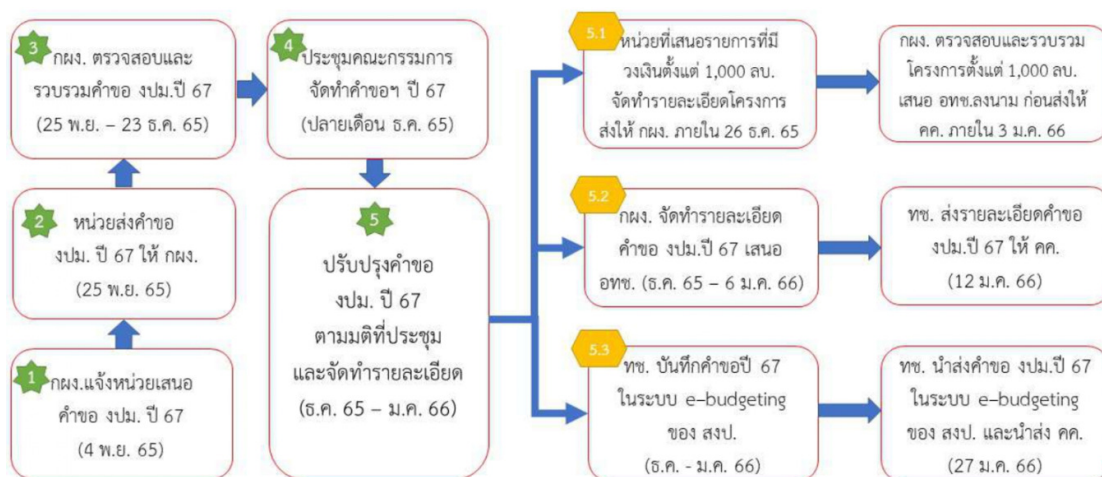

อทช.

ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบ ทบทวนคำของบประมาณปี ๒๕๖๗ ว่ามีโครงการใดเพิ่มเติมหรือ ตกลงไปแล้วให้เสนอเข้ามา และส่งให้ กผง. รวบรวมและเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมายดำเนินการ

๑. ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
๒. ทุกหน่วยงานพิจารณาวางแผนการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมฯ
๓. ทุกหน่วยงานเร่งรัดประสานผู้รับจ้างให้ลงนามในสัญญาให้ครบถ้วนทุกรายการภายในระยะเวลาที่กำหนด
๔. สทช.ที่ ๑ - ๑๘ และ ขทช.ทุกแขวง เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบดำเนินการเองเป็นรายโครงการ และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
๕. สกท. และ สกส. และ สทช.ที่ ๑ - ๑๘ เร่งรัดติดตามการดำเนินการผูกพันเดิมให้เป็นไปตามแผน

๓.๒ ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินส่วนกลางค่างานก่อสร้างและค่าที่ปรึกษา เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

กองบริหารการคลัง ขอรายงานประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินส่วนกลางค่างานก่อสร้างและค่าที่ปรึกษา เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำหรับรายละเอียด ขอให้นางสาวจำลอง รื่นยาน ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน กองบริหารการคลัง เป็นผู้รายงาน

ขอรายงานประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินส่วนกลาง ค่างานก่อสร้างและค่าที่ปรึกษา เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้

★ ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้าง

(ค่างานก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษา) เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับ	สำนักเจ้าของโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	สำนักเจ้าของโครงการ (กำหนด ๓ วันทำการ)		กองบริหารการคลัง (กำหนด ๓ วันทำการ)		ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน (กำหนด ๑ วันทำการ)	
				ทัน	ไม่ทัน	ทัน	ไม่ทัน	ทัน	ไม่ทัน
๑	สำนักก่อสร้างทาง	๖	๓๐,๔๓๙,๙๕๓.๕๙	๕	๑	๖	-	๔	๒
๒	สำนักก่อสร้างสะพาน	๒๐	๑๑๖,๗๖๑,๙๕๐.๑๒	๑๕	๕	๑๖	๔	๑๑	๙
๓	สำนักบำรุงทาง	๒๕	๒๒๑,๙๗๐,๙๓๖.๗๐	๑๑	๑๔	๒๐	๕	๑	๒๔
๔	สำนักสำรวจและออกแบบ	๗	๒๑,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๕	๒	๗	-	๓	๔
๕	สำนักอำนวยความสะดวก	๑	๑๔,๒๒๕,๖๓๙.๙๐	-	๑	๑	-	-	๑
๖	กองแผนงาน	๑	๔๐๕,๔๐๐.๐๐	-	๑	๑	-	๑	-
รวม		๖๐	๔๐๕,๖๗๓,๘๘๐.๓๑	๓๖	๒๔	๕๑	๙	๒๐	๔๐

★ กระบวนการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้าง (กำหนดระยะเวลา ๗ วันทำการ) (จำนวน ๖๐ โครงการ)

สำนักเจ้าของโครงการ	โครงการลำดับที่																									รวมโครงการ	จำนวนโครงการล่าช้า	ร้อยละโครงการที่ล่าช้า
	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕			
สกท.	✓	✓	✓	+	✓	✓																				๖	๑	๑๖.๖๗
สกส.	✓	✓	+	๒	✓	✓	✓	✓	+	✓	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	๕					๒๐	๕	๒๕
สท.	✓	✓	+	๕	✓	✓	✓	+	๒	+	+	+	✓	+	+	+	+	+	+	+	๒	๒	+	+	+	๒๕	๑๑	๔๔
สส.	+	๔	✓	✓	✓	✓	✓																			๗	๑	๑๔.๒๙
สอ.	+	๖																								๑	๑	๑๐๐
กท.	+	๑																								๑	๑	๑๐๐

รวมโครงการที่ล่าช้า

๒๐

นางสาวจำลองฯ

ผอ.กกง.กบค.

- โครงการที่อยู่ภายในกำหนดเวลา ๔๐ โครงการ

งบประมาณ ๒๕๔,๗๘๕,๘๘๙.๗๒ บาท (๖๒.๘๑ %)

- โครงการที่ล่าช้า ๒๐ โครงการ

งบประมาณ ๑๕๐,๘๘๗,๙๙๐.๕๙ บาท (๓๗.๑๙ %)

หมายเหตุ : กำหนดระยะเวลา ๗ วันทำการนับหลังจากวันที่ตรวจรับงานหรือวันที่กรมฯ
ลงรับเรื่อง จนถึงวันที่จัดทำฎีกาและอนุมัติฎีกาในระบบ New GMFIS Thai

★สาเหตุที่ทำให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินล่าช้า จำนวน ๒๐ โครงการ

ลำดับ	สาเหตุ	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	สำนักเจ้าของโครงการ					
				สภท.	สภส.	สปร.	สสอ.	สอป.	กผง.
๑	เอกสาร ไม่ถูกต้อง	๑๔	๗๕.๐๐		๔	๙		๑	
๒	เอกสารเดินทางจากสำนักฯ มายัง กบค. ล่าช้า	๑๒	๖๘.๗๕	๑	๒	๗	๑		๑
๓	เอกสารแนบ ไม่ครบถ้วน	๖	๔๓.๗๕		๓	๒		๑	
๔	มีแก้ไขสัญญา/ค่าปรับ	๒	๑๒.๕๐		๒				
๕	ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผู้รับจ้างไม่เคยเป็นผู้ขายของกรมฯ)	๒	๖.๒๕		๑	๑			

สาเหตุหลักที่ทำให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินล่าช้า แต่สามารถจะแก้ไขได้ คือ เอกสารไม่ครบถ้วน เอกสารไม่ถูกต้อง และการเดินทางของเอกสารมายัง กบค. ล่าช้า ซึ่ง กบค. ได้จัดทำรายการการแนบเอกสารให้กับทุกหน่วยงานรับทราบแล้ว ส่วนนี้จะลดข้อผิดพลาดได้ สำหรับข้อมูลหลักผู้ขาย กบค. ได้มีการเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบและดำเนินการแล้ว หากทุกหน่วยร่วมมือร่วมใจแก้ไขสาเหตุเหล่านี้ได้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินมีความรวดเร็วมากขึ้น

อทท.

ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญในการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้าง หากมีประเด็นปัญหาขอให้ดำเนินการแก้ไข หากหน่วยงานใดยังมีตัวเลขที่ยังไม่ลดลงในแต่ละเดือนให้แจ้งให้ทราบด้วย เพราะหากดำเนินการแก้ไขแล้วต้องมีผลที่ดีขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๓ เรื่อง

วศญ.บ.

๔.๑ การดำเนินงานวิเคราะห์และคัดเลือกโครงข่ายสายรองที่สำคัญของกรมทางหลวงชนบท
คณะทำงานวิเคราะห์และคัดเลือกโครงข่ายสายรองที่สำคัญของกรมทางหลวงชนบทได้รวบรวมข้อมูล เพื่อส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการไประยะหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากระบบเกิดปัญหา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงขอแจ้งที่ประชุมกรมฯ เพื่อทราบและขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการต่อไปอีกประมาณอีก ๑ สัปดาห์ สำหรับรายละเอียดขอให้ นายจตุพงศ์ พาราพันธกุล วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น เป็นผู้รายงาน

นายจตุพงศ์ฯ

สสท.

ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการคัดเลือกโครงข่าย ทช. ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคลงข้อมูลในระบบ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะทำงานฯ ได้นำเสนอแนวทางการคัดเลือกโครงข่ายสายรองที่สำคัญกรมทางหลวงชนบทกับหน่วยงานในภูมิภาค พร้อมซักซ้อมแนวทางการนำข้อมูลลงระบบแผนที่ Dashboard ผ่านแบบฟอร์ม Survey ๑๒๓ โดยเป็นการปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย ซึ่งเน้นไปที่การปรับแนวเส้นทางให้มีความเหมาะสมตามสภาพความเป็นจริง กำหนดส่งภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่เนื่องจากเกิดปัญหาขึ้นหลายประการ จึงขอคณะทำงานฯ ให้มีมติเพื่อขอให้ขยายเวลาออกไป

**นายจตุพงศ์
สสท.**

สรุปภาพรวมการส่งข้อมูลในระบบ

จำนวนแบบฟอร์มที่ส่งเข้ามาในระบบทั้งสิ้น ๘๕๕ เส้นทาง


ตัวอย่างข้อมูลที่ส่งเข้ามาในระบบ



เส้นสีชมพูแสดงเส้นทางที่ขอปรับแก้เข้ามาในแบบฟอร์ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)


โครงข่ายที่ได้คัดเลือกไว้ระดับหนึ่งเป็นสีแดง ระดับที่สองเป็นสีน้ำเงิน และระดับที่สามเป็นเขียว ส่วนเส้นที่เป็นสีชมพูเป็นส่วนที่ภูมิภาคได้ดำเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่วนนี้ส่วนกลางจะนำข้อมูลในส่วนภูมิภาคได้นำเสนอไว้มาพิจารณาและปรับเข้าในระบบ Class ๓ ต่อไป โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีประเด็นปัญหาที่พบหลังจากเปิดระบบให้ภูมิภาคตรวจสอบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานบางประการ ยกตัวอย่างเช่น จากการสำรวจพบว่าเส้นทางโครงข่ายบางเส้นทางมีลักษณะที่ไม่เรียบร้อย มีดังนี้

- เส้นทางภายในจังหวัดสมุทรปราการหาย (รวมระยะ ๕ วัน - ปัจจุบันแก้ไขแล้วเสร็จ)
- เส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่ซ้ำซ้อน (ไม่กระทบกับการดำเนินการของภูมิภาค - ส่วนกลางจะแก้ไขหลังเสร็จสิ้นการนำเข้าข้อมูลในระบบ)

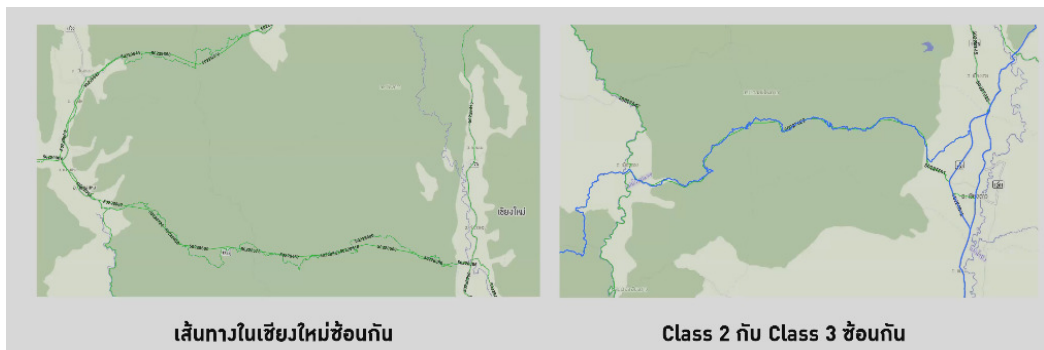

แผนที่ไม่แสดงในระบบ

- เส้นทางแผนที่หายในระบบ
- ระบบแสดงเฉพาะเส้นทางที่ลากจากแบบฟอร์ม
- ระยะเวลาที่กระทบ ๒ วัน (๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕)
- ปัจจุบันแก้ไขแล้วเสร็จ

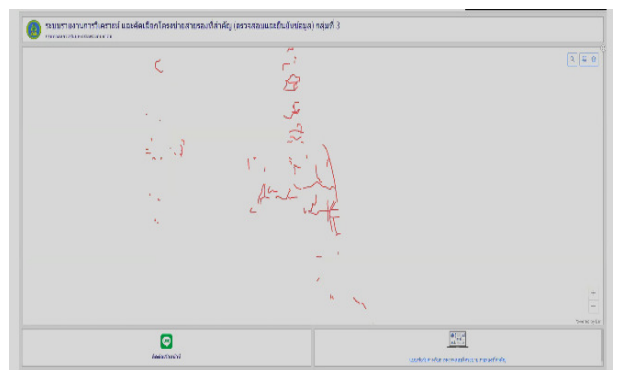

ขยายเวลาการส่งข้อมูลในระบบ

- เนื่องจากระบบมีปัญหาทำให้ส่วนภูมิภาคไม่สามารถใช้งานระบบได้ระยะเวลา ๗ วัน
- ที่ประชุมคณะทำงานฯ จึงอนุมัติขยายเวลาการปิดระบบเป็น วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

นายจตุพงษ์
สสท.

แผนการดำเนินการ ขั้นตอนถัดไป

Timeline	การดำเนินงาน
๒ – ๒๓ ธ.ค. ๖๕	ส่วนภูมิภาคนำเข้าสู่ข้อมูลลงระบบ
๒๖ ธ.ค. – ๑๓ ม.ค. ๖๕	พิจารณาข้อมูลในระบบ เพื่อคัดเลือกเส้นทางขั้นสุดท้าย
กลาง ม.ค. ๖๖	สรุปผลและรายงานต่อผู้บริหาร

อทท.

ขอขอบคุณคณะทำงานฯ และทีมงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ได้ดำเนินการโครงการสายรองที่สำคัญของกรมทางหลวงชนบท โดยขอให้ดำเนินการตามหลักการทางทฤษฎีของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งปัจจุบันตอนนี้มีการดำเนินการแล้วแต่อาจยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร แต่ก็ถือว่าได้มีการเริ่มต้นที่ดี ต้องการให้คนรุ่นใหม่รับรู้ว่าคุณภาพของกรมทางหลวงชนบท , กรมทางหลวง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ต้องแยกให้เห็นเป็นรูปธรรม และผมให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับกรมทางหลวงชนบทในอนาคต

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖

ผส.คก./

รท.ผส.อป.

สำนักอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ขอรายงานแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ แบ่งออกเป็น ๓ ช่วงเวลา ดังนี้

- ช่วงที่ ๑ คือการเตรียมความพร้อม
- ช่วงที่ ๒ คือช่วงควบคุมเข้มข้น
- ช่วงที่ ๓ คือช่วงหลังประเมินเทศกาลไปแล้ว

สำหรับรายละเอียด ขอให้นายพรหมชาติ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณ สำนักอำนวยความสะดวก ปลอดภัย เป็นผู้รายงาน

ผอ.กผง.สอป.

ขอรายงานแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. เป้าหมายการดำเนินงาน และพื้นที่เป้าหมาย

เป้าหมายการดำเนินงาน และพื้นที่เป้าหมาย	
เป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย
๑. บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก และปลอดภัยตลอดการเดินทางบนทางหลวงชนบท	๑. ทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด
๒. สถิติอุบัติเหตุ จานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วง ปีใหม่เฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง	๒. เส้นทางลัด/เลี่ยง , เส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว
๓. ผู้ใช้เส้นทางมีความเชื่อมั่น รวมถึงความมั่นคง และปลอดภัยสูงสุดในการใช้ทางหลวงชนบท	๓. เส้นทางที่มีสถิติอุบัติเหตุ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือรุนแรง
๔. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ในการร่วมกันรณรงค์	๔. บริเวณเสี่ยงอันตราย เช่น ทางโค้งทางร่วม/ทางแยก/ทางม้าลาย เส้นทางที่มีความลาดชัน > ๗ %
	๕. บริเวณจุดตัดรถไฟ

ผอ.กผง.สอบ.

สรุปผลการดำเนินงาน

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประชุมจัดลำดับชั้นทาง อนุกรรมการฯ สส.

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประชุมกับ ทล.หารือแนวทางการจัดลำดับชั้นทาง

๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ประชุมกับ ทล. กำหนดระดับชั้นทางที่ใช้ร่วมกัน

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประชุมกับ อนุกรรมการฯ กระจายอำนาจ

การประชุมกับอนุกรรมการฯ กระจายอำนาจ

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อทช. ได้เข้าร่วมประชุม อนุกรรมการกระจายอำนาจเกี่ยวกับประเด็นข้อปรับปรุงในแผนกระจายอำนาจฉบับที่ ๓ ประเด็นข้อปรับปรุง คือ ขอบเขตความรับผิดชอบของราชการส่วนกลางและภูมิภาคเพิ่มเติมข้อความ “การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสู่อำเภอ และอำเภอสู่อำเภอ” และข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้อง

๒. ช่วงเวลาดำเนินการ

ปฏิทินแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (๑ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕)

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน/สะพาน ในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัยไร้หลุมบ่อ มีเครื่องหมายจราจรอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรครบถ้วน
- ตรวจสอบ/ปรับปรุง ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ทางม้าลาย ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร โดยเฉพาะ ถนนฝั่งเมือง เส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว , เส้นทางลัด/เลี่ยง ,จุดตัดทางรถไฟ ให้ใช้การได้ดี
- โครงการก่อสร้าง/บูรณะถนนและสะพานโครงการก่อสร้าง/บูรณะถนนและสะพาน โดยเฉพาะงานที่ดำเนินการบนเส้นทางที่เปิดใช้การจราจร ต้องวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับช่วงเทศกาล พร้อมเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อคืนพื้นผิวจราจรให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยพร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน ป้ายจำกัดความเร็ว ไฟวับวาบและจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอตามรูปแบบการติดตั้งเครื่องหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการทำงานก่อสร้าง หน่วยก่อสร้างที่มีที่ปรึกษาควบคุมงาน จะต้องสั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำโครงการฯ พร้อมจัดรถตรวจการณ์วิ่งตรวจตราเฝ้าระวัง ตลอดช่วงเทศกาล
- เตรียมความพร้อม และทดสอบระบบสายด่วน ๑๑๔๖
- เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบกล้อง CCTV ที่ติดตั้งบนถนนและสะพาน ในความรับผิดชอบ
- เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบวิทยุสื่อสาร
- เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบการประชุมทางไกล (Conference)
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การอำนวยความสะดวกและปลอดภัย บนถนนของกรมทางหลวงชนบทโดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น รถประชาสัมพันธ์ คลิปเสียง (Mobile Unit) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุ โทรทัศน์ แอปพลิเคชัน โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงผ่านทาง อส.ทช. โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักเลขาธิการกรม (กลุ่มประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่)

ผอ.ภผง.สอป.

ช่วงควบคุมเข้มข้น (๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๔ มกราคม ๒๕๖๖)


- โครงการก่อสร้าง/บูรณะ ถนนและสะพาน คืบหน้าผิวจราจรเรียบร้อยแล้วพร้อมหยุดงาน โดยติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง/สัญญาณจราจร อุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนตามรูปแบบที่กรมแนะนำ และรายงานผลตามแบบฟอร์ม กตป.๐๕
- จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทข. จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานทางหลวงชนบท ๑๘ ศูนย์ และศูนย์ความปลอดภัยแขวงทางหลวงชนบทช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้ง ๗๖ จังหวัด เพื่อบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมและจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผน อำนวยฯ ที่กรมกำหนด รวมทั้งประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลอุบัติเหตุกับ สปภ. จังหวัด/อำเภอ และรายงานข้อมูลไปยังศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานทางหลวงชนบทที่กำกับ
- จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนทางหลวงชนบท แบบที่บูรณาการร่วมกับ ทล. และ/หรือ ขบ. โดยรูปแบบการดำเนินการให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
- จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายด่วน ๑๑๔๖ โดยทำหน้าที่ประสานงานรับ/แจ้งเหตุการณ์ต่างๆ กับหน่วยงานในสังกัดและศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม (สปภ.คค.) ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง
- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ผิดปกติผ่านกล้อง CCTV ติดตั้งบนถนน และสะพานในความรับผิดชอบ
- จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสารผ่าน ย่านความถี่ VHF ระบบทวนสัญญาณ บนคลื่นความถี่ ๑๗๒.๐๗๕ /๑๖๗.๔๐๐ MHz และคลื่นความถี่ตรง ๑๖๕.๓๐๐ MHz. พร้อมทั้งใช้งานโปรแกรม Team Speak ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดต่อประสานงานในภาพรวมกับส่วนกลาง และสำนักงานทางหลวงชนบทที่สังกัด
- เฝ้าระวังอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ทาง เข้าช่วยเหลือเมื่อพบรถเสีย เมื่อเกิดอุบัติเหตุประสาน หน่วยงานกู้ภัยหรือหน่วยงานสาธารณะสุขในพื้นที่เข้าช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก ในขณะที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน พร้อมเข้าเก็บข้อมูลจุดที่เกิดอุบัติเหตุ โดยรูปแบบการดำเนินการให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
- เฝ้าระวังเส้นทางพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟวับวาวหรือเตือนที่เฝ้าระวังบริเวณเสี่ยงอันตราย ทางลาดชันและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หรือตามมาตรการที่ คค. กำหนด โดยรูปแบบ การดำเนินการให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ (สอป.ได้แจ้งเวียนบริเวณที่เกิด อุบัติเหตุบ่อยครั้งจากระบบ ARMS ไปเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕)
- ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยถนนของกรมทางหลวง ชนบท ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน คลิปเสียง หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ/โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์
- กรณีเกิดอุบัติเหตุใหญ่หรือรุนแรง จะดำเนินการลงพื้นที่ที่เกิดเหตุภายใน ๒๔ ชม. เพื่อทำการสืบสวนอุบัติเหตุ วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขทั้งระยะ เร่งด่วนและระยะยาว (อุบัติเหตุทางถนนที่มีจำนวนผู้เสียชีวิต ๒ รายขึ้นไป หรือมีผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ ๔ ราย ขึ้นไป)
- จัดเจ้าหน้าที่ Standby ระบบประชุมทางไกล (Conference) กรณี สปภ. คค. จัดประชุม ช่วงหลังเทศกาล (วันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖)
- สรุปรวบรวมสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนโครงข่ายทางหลวงชนบท พร้อมทำการวิเคราะห์เพื่อหา แนวทางการแก้ไข
- พิสูจน์ทราบจุดเกิดเหตุ เสนอแนวทางการแก้ไข/ป้องกัน พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ
- เร่งดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขจุด/บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ระยะสั้น (เร่งด่วน) และระยะยาว

ผอ.ภผง.สอป.

ตัวชี้วัด

สถิติอุบัติเหตุย้อนหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ของ ทช.

สถิติอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วงปีใหม่เฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง

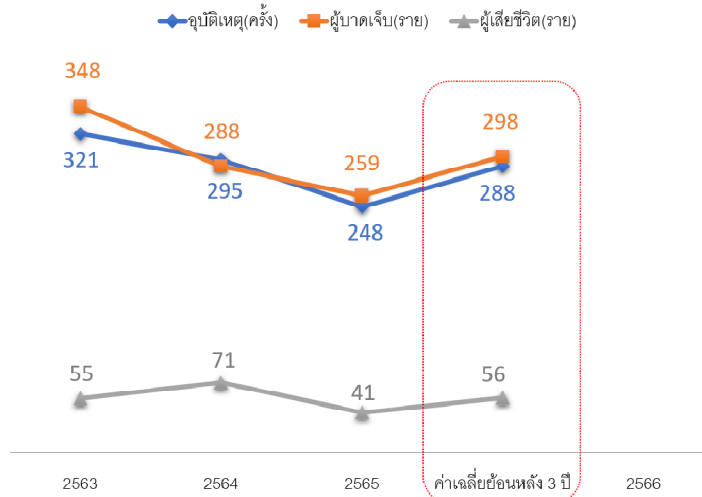

ค่าเป้าหมายสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบทช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ตามตัวชี้วัด (ลดลงร้อยละ๕)

- จำนวนอุบัติเหตุ < ๒๗๓ ครั้ง
- จำนวนผู้บาดเจ็บ < ๒๘๓ ราย
- จำนวนผู้เสียชีวิต < ๕๓ ราย



สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่
QR CODE ด้านล่างครับ



เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

อทช.

ขอสอบถาม ปัจจุบันหน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบ เรื่องสายด่วน ๑๑๔๖ และเจ้าหน้าที่ตอบคำถามเป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนใดอย่างไร

นายจิรายุทธิ์ฯ สลก.

ขอชี้แจง สายด่วน ๑๑๔๖ ปัจจุบันเป็นภารกิจของสำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับสายด่วน ๑๑๔๖ และตอบคำถาม เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ได้จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำตลอด ๒๔ ชั่วโมง

อทช.

ขอให้เน้นย้ำเรื่องการตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ เพราะถือเป็นสิ่งสำคัญ หากเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่สามารถตอบคำถามได้ขอให้อย่าตอบคำถาม เพราะอาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดและคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และต้องคัดเลือกคนที่มีความสนใจเย็นในการตอบคำถามด้วย เพราะประชาชนที่โทรเข้ามาจะมีหลากหลายรูปแบบ หลกหลายอารมณ์ จึงต้องใจเย็นและทำความเข้าใจกับประชาชนเป็นอย่างมาก

รทช.บว.

สรุปประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดี คือ เรื่องจุดตัดทางรถไฟ ขอให้ทุกหน่วยงานสำรวจตรวจสอบบริเวณที่เป็นจุดตัดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟที่มีเครื่องกั้นพร้อมสัญญาณไฟวับวาวอีก ๑๑๑ แห่ง ขอให้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยรัฐบาลและคณะกรรมการการได้เน้นย้ำเรื่องจุดตัดทางรถไฟมาโดยตลอด ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลว่าจุดตัดทางรถไฟที่อยู่ในระนาบดิน ๑๑๑ แห่ง กรมฯ พร้อมและส่งงบประมาณไปเพื่อให้หน่วยงาน

รทช.บว.

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้มีการประชุมซักซ้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่สายด่วน ๑๑๔๖ ของกรมฯ และนำข้อมูลการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ บนสายทางหลวงชนบทให้กับเจ้าหน้าที่สายด่วน ๑๑๔๖ เพื่อเป็นข้อมูลในการตอบคำตอบของประชาชนที่โทรเข้ามาสอบถาม เพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการก่อสร้างต่าง ๆ บนถนนโครงข่ายสายทางหลวงชนบท

อทช.

ขอให้ สทช.ที่ ๑ - ๑๘ และ ขทช.ทุกแขวง เตรียมความพร้อมและดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดขอรายงานให้รับทราบด้วย และขอให้ รทช.บว. และ สบร. ติดตามเน้นย้ำ และเร่งรัดหน่วยดำเนินการเรื่องหลุมบ่อ ไฟฟ้าแสงสว่าง ให้มีความเรียบร้อยและปลอดภัยสำหรับประชาชน

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบ

๑. รทช.บว. และ สบร. ติดตาม เน้นย้ำ และเร่งรัดหน่วยงานดำเนินการเรื่องหลุมบ่อ และไฟฟ้าแสงสว่างให้มีความเรียบร้อยและปลอดภัยสำหรับประชาชน

๒. สทช.ที่ ๑ - ๑๘ และ ขทช.ทุกแขวง เตรียมความพร้อมและดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖

๔.๓ สรุปรางวัลที่กรมทางหลวงชนบทได้รับประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

นายโกศลฯ

สำนักงานเลขาธิการกรมขอรายงานสรุปรางวัลที่กรมทางหลวงชนบทได้รับประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรายละเอียดขอให้ นางสาววิภา ธัญญเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการกรม เป็นผู้รายงาน

ลนภ.

นางสาววิภาฯ

ขอสรุปรางวัลที่กรมทางหลวงชนบทได้รับประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๖ รางวัล ดังนี้

ผอ.กปผ.สสภ.

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้รับผลคะแนนวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

๒. ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้าง SME ในมิติของจำนวนเงิน และสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

๓. รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรและการจัดการความรู้ ประกาศผลพิจารณารางวัลวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

๔. DIGI Data Awards ๒๐๒๒ รางวัลชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล

๕. รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๕ (Digital Government Awards ๒๐๒๒) รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

นางสาววิภา
ผอ.กปผ.สสท.

๖. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดย กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่
- รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
(ด้านการเบิกจ่าย)

สำหรับรางวัลที่กรมทางหลวงชนบทได้รับนั้น ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับองค์กร กรมทางหลวงชนบทจะมุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาหน่วยงานและปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

อทช.

ขอชื่นชม กปผ.สสท. ดำเนินการในการจัดทำสื่อเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้รับคำชื่นชมจาก
กระทรวงคมนาคม และนำสื่อของกรมทางหลวงชนบทไปเผยแพร่อยู่ตลอด ในส่วนของรางวัล
ที่กรมทางหลวงชนบทได้รับเป็นผลงานจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายจึงทำให้ได้รับรางวัล
อันทรงคุณค่า สร้างความภาคภูมิใจให้กับกรมทางหลวงชนบท

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๒ เรื่อง

๕.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินงานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่

ความรับผิดชอบ

รทช.บว.

ความก้าวหน้าการดำเนินงานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดประชุมไปแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และในช่วงเดือน
มกราคม ๒๕๖๖ จะดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง ผลสรุปของปี ๒๕๖๕ ได้ตัดยอด ๕๐ %
ส่วนที่เหลือ ๕๐ % ตัดยอดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ครึ่งสุดท้าย และได้รายงานที่ประชุม
กรมฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เรื่องนี้ได้จัดทำหนังสือแจ้งให้ดำเนินการทำรายการทั้งหมดแล้ว ส่วนที่ค้างค้างและส่วนที่เพิ่ม
ยอดในปี ๒๕๖๕ สรุปเรียบร้อยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในส่วนเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
ได้ดำเนินการซักซ้อมแล้ว ส่วนในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จะดำเนินการติดตามผลการ
ดำเนินงาน จึงขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
รายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและดำเนินการเรื่องสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานภายใน
วันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

๕.๒ การสัมมนากรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วศญ.ส.

ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องการสัมมนากรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ จะดำเนินการให้จัดสัมมนา ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรามารักษ์
เด็นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ กระบวนการปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจะประกอบไปด้วย อธิบดี รองอธิบดี วิศวกรใหญ่ ผู้อำนวยการสำนัก
ส่วนกลาง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ผู้อำนวยการสำนักงาน

วศญ.ส.

ทางหลวงชนบทที่ ๑ - ๑๘ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ สอ. รวมทั้งหมดประมาณ ๑๕๐ - ๑๗๐ คน ดำเนินการเป็นเวลา ๒ วัน

- วันที่ ๑ จะมีการลงทะเบียน โดยเรียนเชิญท่านอธิบดีเป็นประธานเปิดงานสัมมนา และเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย ในหัวข้อเรื่องผู้นำสมัยใหม่และบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร ในช่วงเย็นรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
- วันที่ ๒ เป็นการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อระเบียบต่าง ๆ ที่ท่านอธิบดีได้เน้นย้ำ และช่วงบ่ายจะมีวิทยากรจากภายนอกบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับความคิด ทักษะคติในการทำงานและช่องว่างระหว่างวัย และสัมมนาจะสิ้นสุดเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น.

อทช.

กรมทางหลวงชนบทไม่ได้มีการจัดประชุมสัมมนามานานแล้ว ก็จะมีเรื่องของภาพรวมของผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักภูมิภาค ผู้อำนวยการแขวง ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม สำหรับสถานที่จัดสัมมนา และวิทยากร มอบให้ท่าน วศญ.ส. เป็นผู้ดำเนินการ และในส่วนของงานเลี้ยงสังสรรค์ ขอให้ สบร. และทีมงานเป็นผู้ดำเนินการ สำหรับหลักสูตรที่จะนำมาเป็นหัวข้อในการสัมมนาผมได้หารือกับท่าน วศญ.ส. แล้วถ้าได้ข้อสรุปจะนำมาให้ท่านผู้บริหารพิจารณาอีกครั้ง

วศญ.ส.

ขอชี้แจง ในส่วนของ สอ. ในปีงบประมาณปี ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณในการอบรม ผู้อำนวยการแขวงฯ แล้ว แต่หากเร่งดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อาจจะต้องของบเหลือจ่ายมาดำเนินการอบรมก่อน

อทช.

เรื่องบุคลากรถือเป็นเรื่องที่ต้องความสำคัญ โดยเฉพาะ ผอ.ททช. และ ผอ.บทช. จึงขอให้ สอ. พิจารณาดำเนินการเรื่องการจัดอบรมด้วย และขอให้ สกม. เป็นพี่เลี้ยงในด้านกฎหมาย เพราะเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการให้ถูกต้อง

ผส.กม.

อธิบดีได้เน้นย้ำข้อสังเกตเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายว่าเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะไม่มีใครคุ้มครองท่านได้ ถ้าปฏิบัติตามกฎหมายจะปลอดภัยกับตัวท่านเอง และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อีกเรื่องหนึ่งได้ขำมาว่าจังหวัดหรือแขวงฯ ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องบัญชีถัวจ่าย เงินที่ สกท. โอนไป ไม่ว่าจะเป็นค่าอุทธรณ์ ค่าตักสำรวจ หรือค่าเวนคืน บางแขวงฯ นำเงินส่วนนี้ไปเข้าบัญชีถัวจ่าย ซึ่งตามระเบียบจะดำเนินการแบบนี้ไม่ได้ จะต้องเบิกจ่ายในเงินของคลังจังหวัด เบิกของธนาคารกรุงไทยแบบเป็นเช็คให้กับประชาชนเพื่อสามารถนำเงินนี้เข้าบัญชีถัวจ่าย บัญชีถัวจ่าย คือ บัญชีเรียกกู้ฝากกระแสรายวันที่นำมาถัวจ่ายได้เฉพาะเนื้อที่ที่เพิ่มขึ้น ยอดเงินในส่วนนั้นตรงมาอยู่ในบัญชีถัวจ่าย ไม่สามารถนำเงินในส่วน สกท.ไปเข้าบัญชีถัวจ่ายแล้วเบิกให้กับประชาชนแบบนี้ ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเจ้าหน้าที่ของ สกม. ได้รายงานมาว่าบางแขวงฯ ยังดำเนินการในลักษณะแบบนี้อยู่ ซึ่งผิดระเบียบอย่างยิ่ง เพราะกรมบัญชีกลางให้กรมทางหลวงชนบทเฉพาะนำเงินบัญชีถัวจ่ายรายที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถนำเงินไปจ่ายค่าอาคารได้ สกม. จึงมีแนวทางชักข้อมภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมาย โดย ผส.กม.จะเป็นผู้บรรยายในเรื่องนี้ และให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อกฎหมายให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเข้าตรวจสอบของ สตง. หรือหน่วยงานอื่น

อทช.

ขอสอบถาม บางแขวงฯ ที่ไปทำงานให้ท้องถิ่น และแจ้งให้ผมทราบ ผมจะไม่รับ คือ ในกรณี
อย่างนี้ งบของจังหวัดหรือกลุ่มในจังหวัด และแขวงฯ ไปดำเนินการแต่ไม่ใช่ในพื้นที่ของ ทช.
ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาแจ้งให้ผมเพื่อทราบ แต่ถ้างานใดเป็นงานของท้องถิ่นแล้วผู้ว่าราชการ
จังหวัดแจ้งมา ถ้าผมไม่รับงานได้หรือไม่

ผส.กม.

เนื่องจากกรมบัญชีกลางไม่ได้มีการแจ้งเวียนว่าได้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานได้รับทราบ แต่ถ้า
ทราบ คือ ทราบไว้เฉย ๆ ไม่มีข้อผูกมัดที่จะให้ท่านอธิบดีเป็นผู้อนุมัติ เป็นระเบียบเพื่อให้
อธิบดีทราบ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ได้ไปทำงานให้กับจังหวัด อธิบดีจะไม่ใช่
ผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ แขวงฯ ที่เป็นหน่วยดำเนินการ เพราะถือ
เป็นผู้ประกาศประกวดราคา และมีการตรวจรับงาน หากดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างก็จะส่งผลให้เกิดความผิดได้

อทช.


ขอให้ ขทช.ทุกแขวงฯ จัดทำหนังสือไปแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยว่าไม่ต้องทำหนังสือแจ้งมา
ที่ผม เพราะว่าไม่ใช่งานของ ทช. ในส่วนนี้เป็นภารกิจของแขวงกับทางจังหวัด และอีกเรื่อง
ของคดีฟ้องร้องระหว่างแขวงฯ กับ ท้องถิ่น เรื่องต่าง ๆ ก็ไม่ต้องแจ้งหนังสือมาให้กับผม
เพราะไม่ใช่โครงข่ายของ ทช. เช่นกัน เพราะจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๗.๑๕ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายการประชุม
(นางสาวดวงขวัญ รักษ์ธรรม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายการประชุม
(นางสาวทุนจิต ลีละเศรษฐกุล)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
